

# CDMX

## Alameda Oriente

**Avance global**

- Programado: 6.73%
- Real: 4.97%
- Semanal: 0.9%
- Financiero: 4.90%

**Avance 2025**

- Programado: 42.06% \*
- Real: 31.06%
- Semanal: 5.62%
- Financiero: 36.68%

\*Se realizó un ajuste en los programas

**Inversión total 2025-2027:** 2,000 mdp  
**Inversión 2025:** 267 mdp | (16% de 2 puentes)

**Meta total:** 2 puentes | 1,174.95 m longitud total.

**Inicio:** 17 de junio de 2025  
**Término:** Octubre 2027  
**Término meta 2025:** Diciembre


**1,798,474** habitantes beneficiados

**6,000** empleos generados

**15 min** ahorro en tiempo

### Empresas

- **Contratista:** CEMEX Concretos, S.A. de C.V.
- **Supervisión:** ORVA Ingeniería, S.A. de C.V.

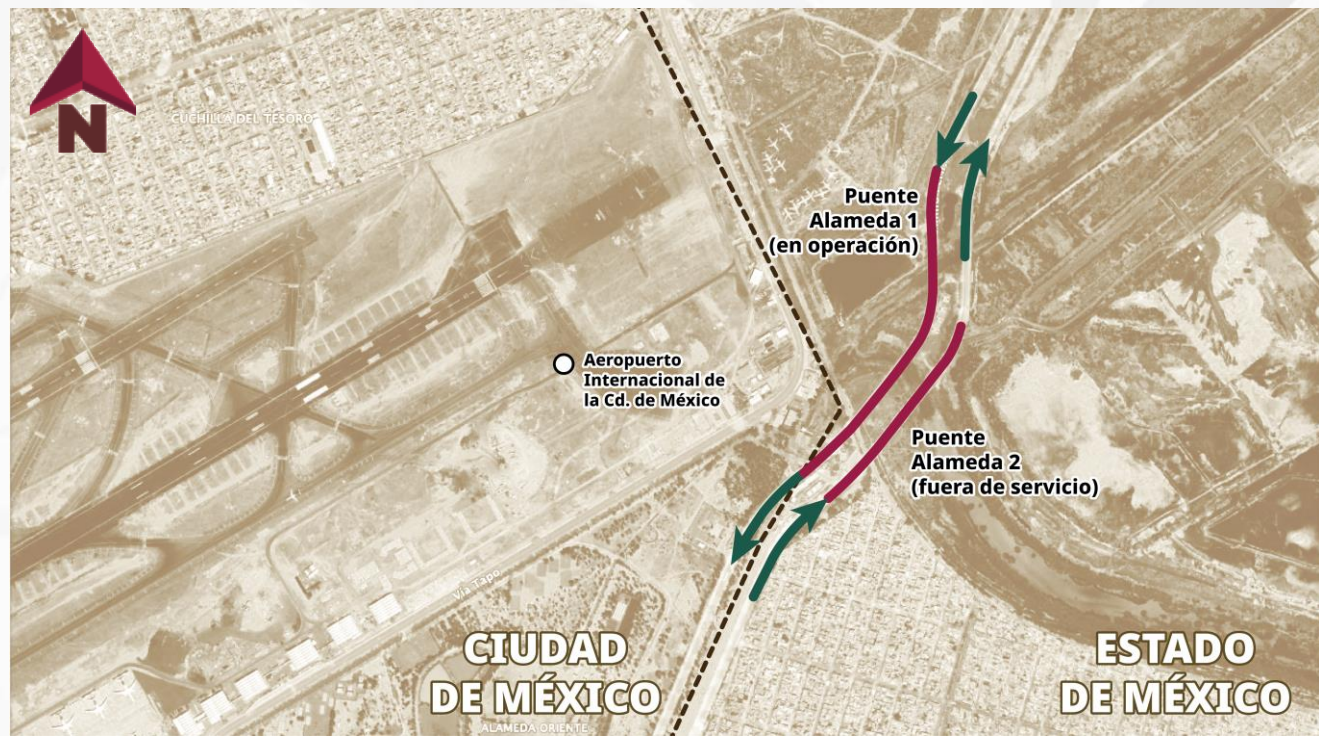

# Construcción de dos Puentes en Alameda Oriente

## (Interconexión con las Autopistas Mex 150D y Mex 136D)




Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Intervención	Unidad	Ejecutado	Faltante	25/sep/25 al 06/10/25	
			Acumulado		Programado	Ejecutado
Estudios (Puente 1 y 2)	1	Actividad	1	-	-	-
Proyectos (Puente 1 y 2)	1	Actividad	1	-	-	-
Demolición y retiro de estructura (Puente 2)	500	m	290	210	66.48	60
Suministro y colocación de acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 para pilotes (Puente 2)	843,000	kg	73,918.92	769,081.08	12,767.04	21,353.80
Suministro y colocación de concreto clase I, f'c 400 kg/cm2 para pilotes (Puente 2)	2,072	m3	74	1,998	31.37	74
Hincado de pilotes de 40cmx40cm de perforación (Puente 2)	12,898	m	0	12,898	0	0
Desmantelamiento de postes de alumbrado (Puente 2)	18	Pzs	18	-	-	-
Desmantelamiento, almacenamiento, rehabilitación y reubicación de señal tipo puente (Puente 1 y 2)	2	Pzs	2	-	-	-
Despalme en caminos de servicio (Puente 2)	4,740.40	m3	3,560.73	1,179.67	175.75	479.62
Excavación en caminos de servicio (Puente 2)	58,115.16	m3	6,379.03	51,736.13	233.33	4,100.09
Mejoramiento con tezontle en caminos de servicio (Puente 2)	42,615.03	m3	6,904.14	35,710.89	1,782.13	1,865.73

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

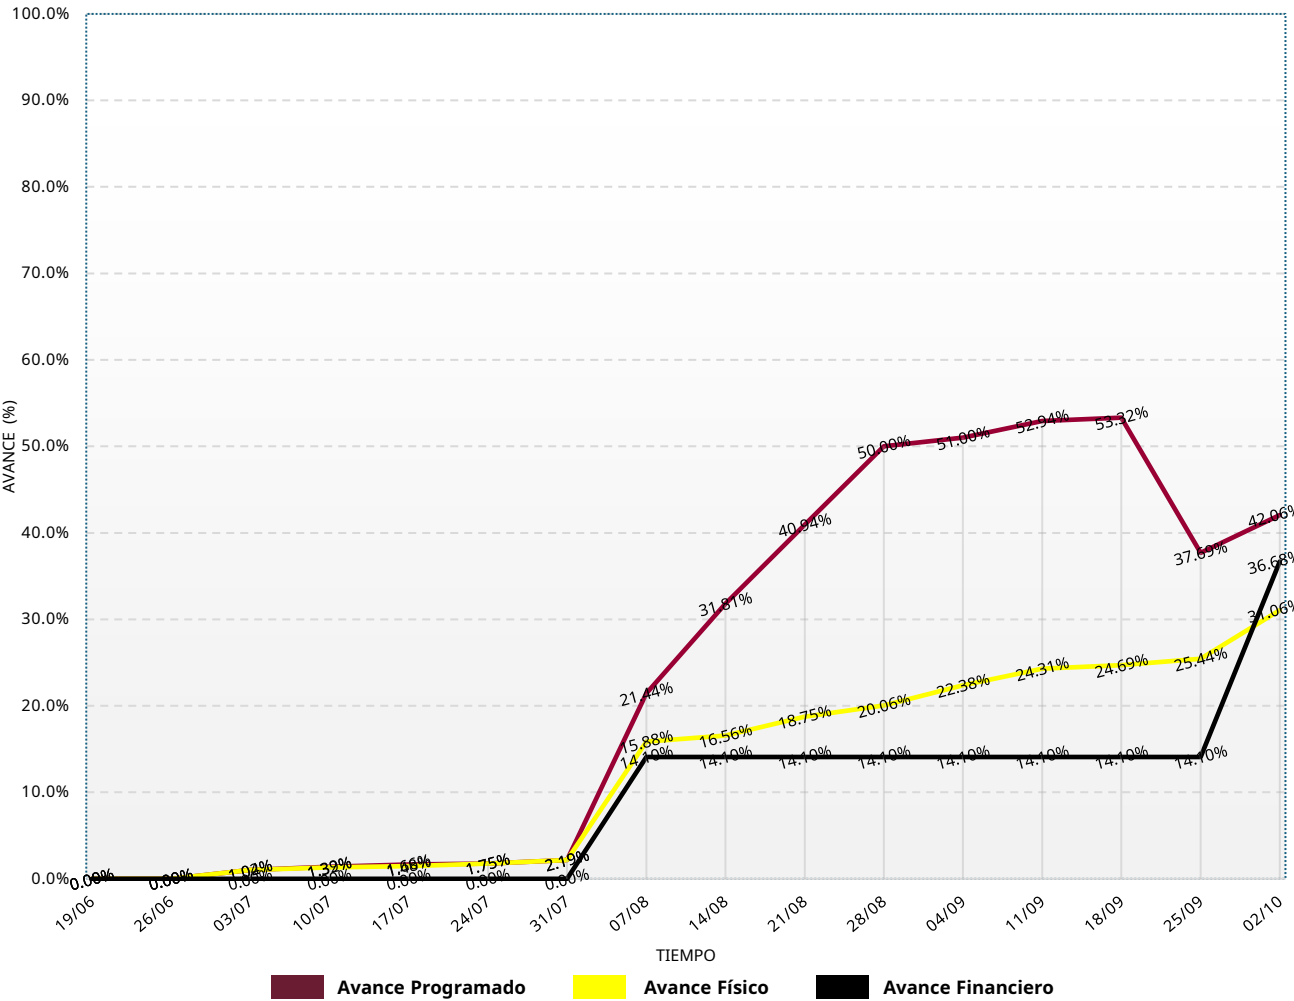

	19 al 25 de septiembre 2025	25 de septiembre al 02 de octubre 2025
Fuerza de Trabajo (personas)	32	32
Maquinaria	7	7
