

Puente El Chical







Colima


Avance global

• Programado: 9.12 %	• Semanal: 2.74 %
• Real: 9.04 %	• Financiero: 0.0 %

Avance 2025

• Programado: 39.9 %	• Semanal: 11.90 %
• Real: 39.6 %	• Financiero: 0.00%

-  **Inversión total 2025-2026:** 110 mdp
Inversión 2025: 20.6 mdp
-  **Meta total:** 0.736 km: 0.370 km de puente y 0.369 km de accesos **(es un Proyecto Integral y el Proyecto Ejecutivo fue entregado)**
-  **Meta 2025:** 22.8 % del Puente
- Fecha de inicio:** 11 de agosto, 2025
Fecha de término: 10 de agosto, 2026
 **Termino meta 2025:** 31 de diciembre, 2025
-  **4,053** habitantes beneficiados
-  **330** empleos generados
- 15 min** ahorro en tiempo

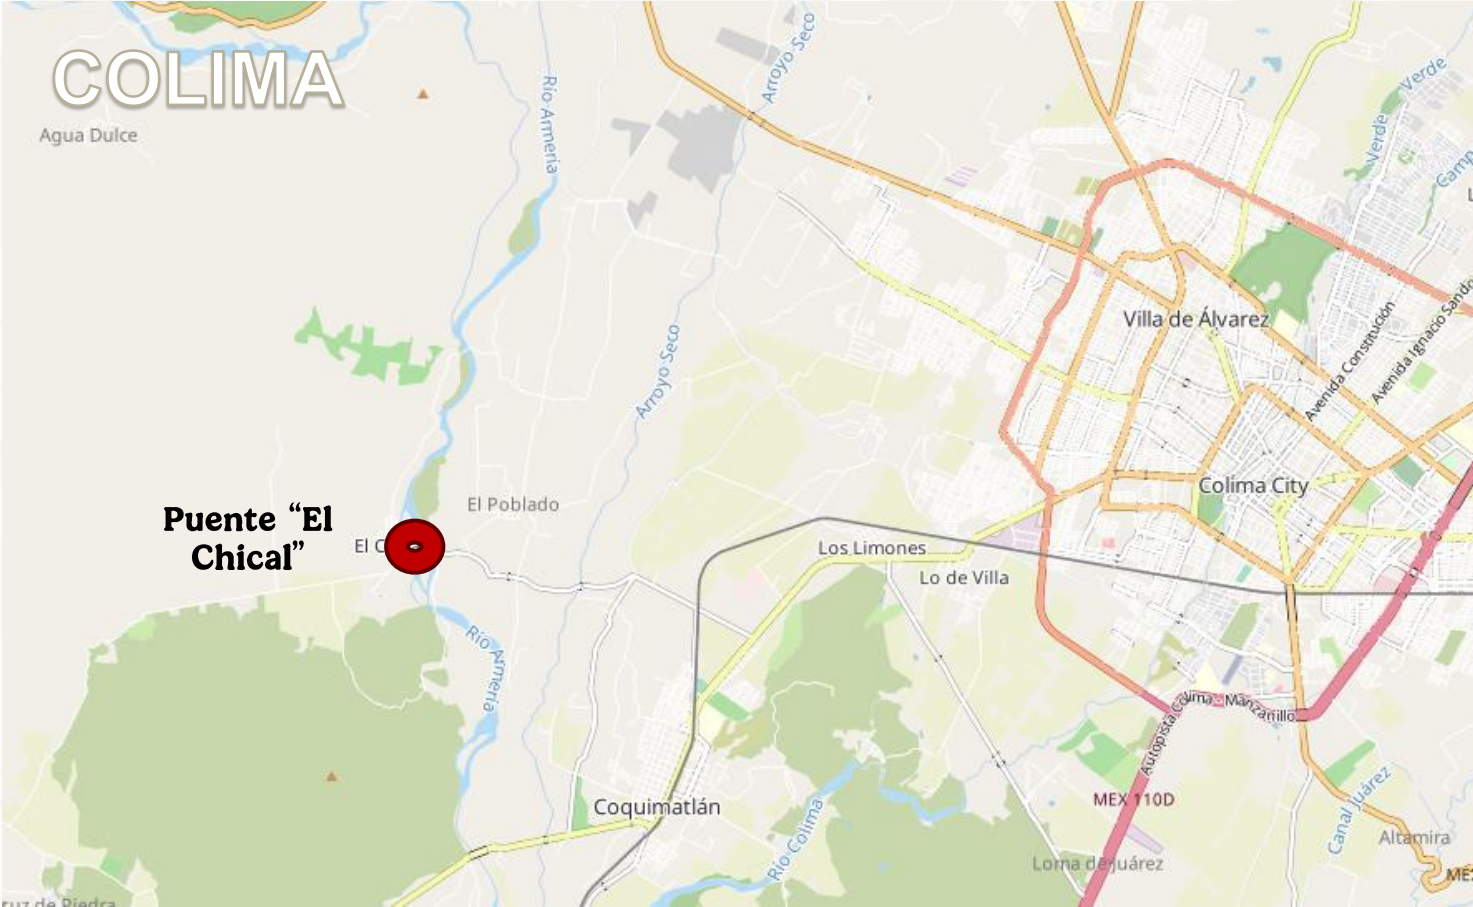


Tramo	Empresas
Construcción Puente El Chical	<ul style="list-style-type: none">• Contratista: TRITURADOS Y ASFALTOS DE ATLACOMULCO, S.A DE C.V Y GUCOC, S.A DE C.V• Supervisión: ---

Puente El Chical

Colima

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

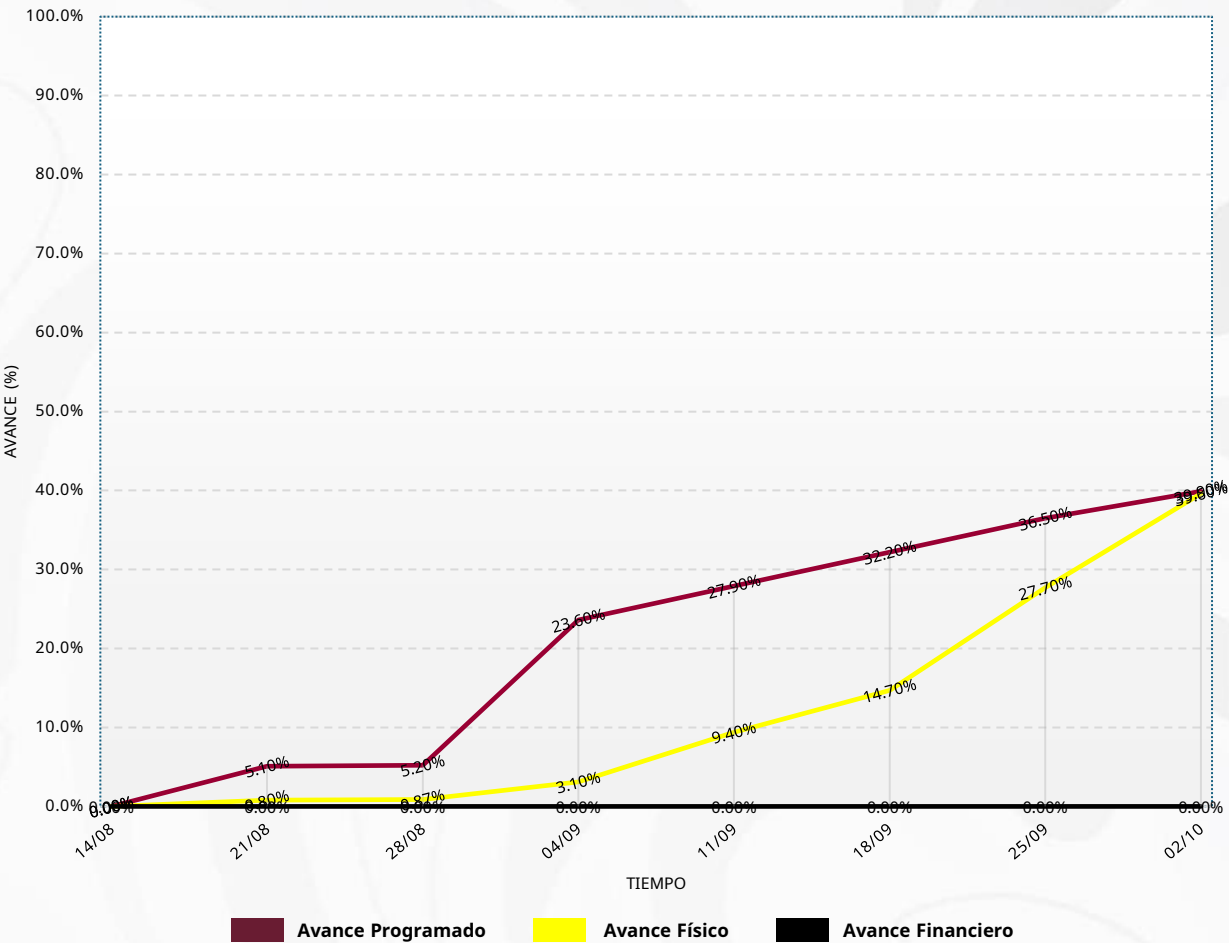

	19 de septiembre al 25 de septiembre	26 de septiembre al 02 de Octubre
Fuerza de Trabajo (personas)	30	30
Maquinaria	5	5

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	26/09/25 al 02/10/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Resumen de Obra						
Limpieza, Trazo y Nivelación (m2)	9,784.0	9,784.0	0.0	0.0	0.0	
Pilas de cimentación (Pza)	24.0	10.0	14.0	3.0	0.0	
Columnas (Pza)	30.0	3.0	27.0	0.0	3.0	
Construcción de cabezales y bancos (m3)	10.0	1.0	9.0	1.0	1.0	
Trabes AASHTO VI (Pza)	45.0	0.0	45.0	0.0	0.0	
Montaje de trabes (Pza)	45.0	0.0	45.0	0.0	0.0	
Colado de diafragma y losa (m3)	648.0	0.0	648.0	0.0	0.0	
Carpeta Asfáltica (m3)	166.8	0.0	166.8	0.0	0.0	
Guarniciones y banquetas (m)	720.0	0.0	720.0	0.0	0.0	
Accesos, señalamiento y obras complementarias (m)	139.0	0.0	139.0	0.0	0.0	
Conformación de camino de desvío y dragado del cauce (m3)	125,000.0	10,000.0	115,000.0	2,600	0.0	
