

CDMX

Alameda Oriente

Avance global

- Programado: 6.03%
- Real: 4.07%
- Semanal: 0.12%
- Financiero: 1.88%

Avance 2025

- Programado: 37.69% *
- Real: 25.44%
- Semanal: 0.75%
- Financiero: 14.10%

*Se realizó un ajuste en los programas

Inversión total 2025-2027: 2,000 mdp
Inversión 2025: 267 mdp | (16% de 2 puentes)

Meta total: 2 puentes | 1,174.95 m longitud total.

Inicio: 17 de junio de 2025
Término: Octubre 2027
Término meta 2025: Diciembre

1,798,474 habitantes beneficiados

6,000 empleos generados

15 min ahorro en tiempo


Empresas

- **Contratista:** CEMEX Concretos, S.A. de C.V.
- **Supervisión:** ORVA Ingeniería, S.A. de C.V.



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

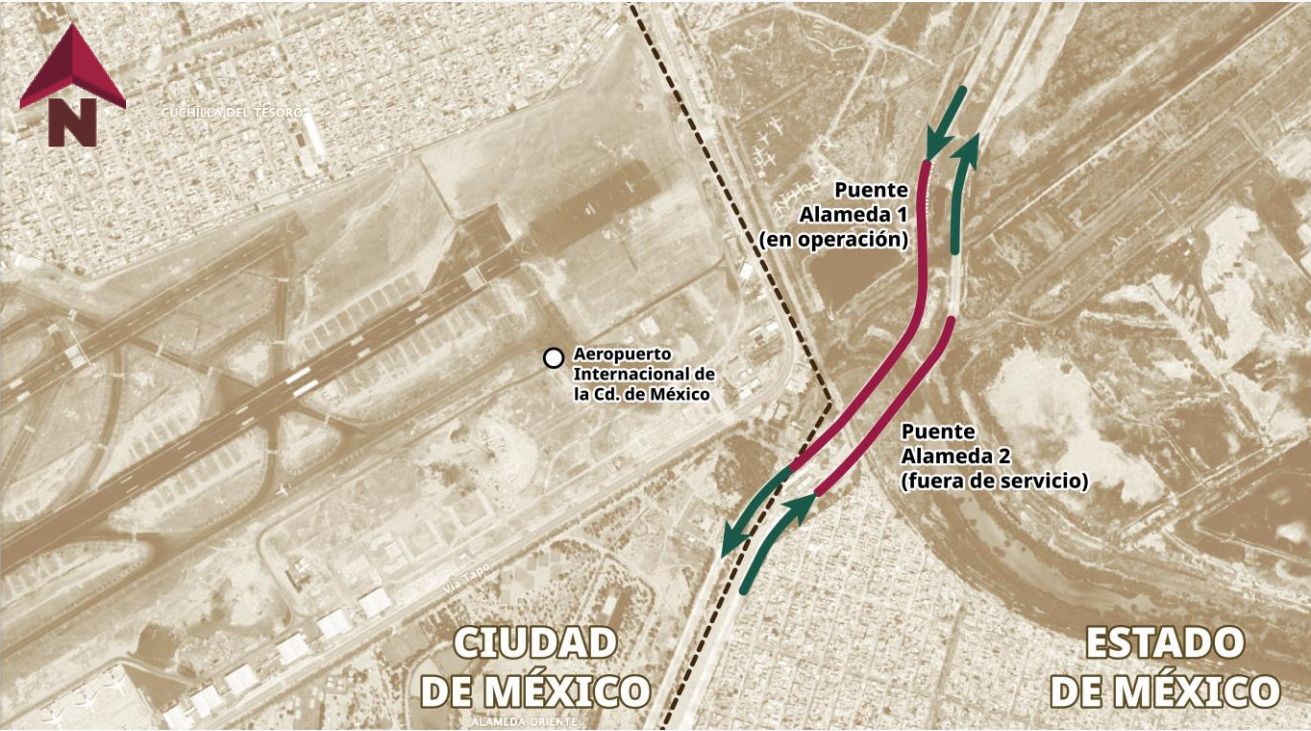

Nivel de Servicio en estudio



Situación actual

Nivel de Servicio en estudio



Proyecto


Construcción de dos Puentes en Alameda Oriente

(Interconexión con las Autopistas Mex 150D y Mex 136D)

Elemento	Intervención	Unidad	Ejecutado		19/sep/25 al 25/sep/25	
			Acumulado	Faltante	Programado	Ejecutado
Estudios (Puente 1 y 2)	1	Actividad	1	0	0	0
Proyectos (Puente 1 y 2)	1	Actividad	1	0	0.06	0
Demolición y retiro de estructura (Puente 2)	500	m	230	270	66.48	0
Suministro y colocación de acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 para pilotes (Puente 2)	843,000	kg	52,565.12	790,434.88	12,767.04	52,565.12
Suministro y colocación de concreto clase I, f'c 400 kg/cm2 para pilotes (Puente 2)	2,072	m3	0	2,072	31.37	0
Hincado de pilotes de 40cmx40cm de perforación (Puente 2)	12,898	m	0	12,898	0	0
Desmantelamiento de postes de alumbrado (Puente 2)	18	Pzs	18	0	0	0
Desmantelamiento, almacenamiento, rehabilitación y reubicación de señal tipo puente (Puente 1 y 2)	2	Pzs	2	0	0.35	0
Despalme en caminos de servicio (Puente 2)	4,740.40	m3	3,081.11	1,659.29	175.75	51.39
Excavación en caminos de servicio (Puente 2)	58,115.16	m3	2,278.94	55,836.22	233.33	162.66
Mejoramiento con tezontle en caminos de servicio (Puente 2)	42,615.03	m3	5,038.41	37,576.62	1,782.13	1,988.41

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

* Ajuste de porcentajes

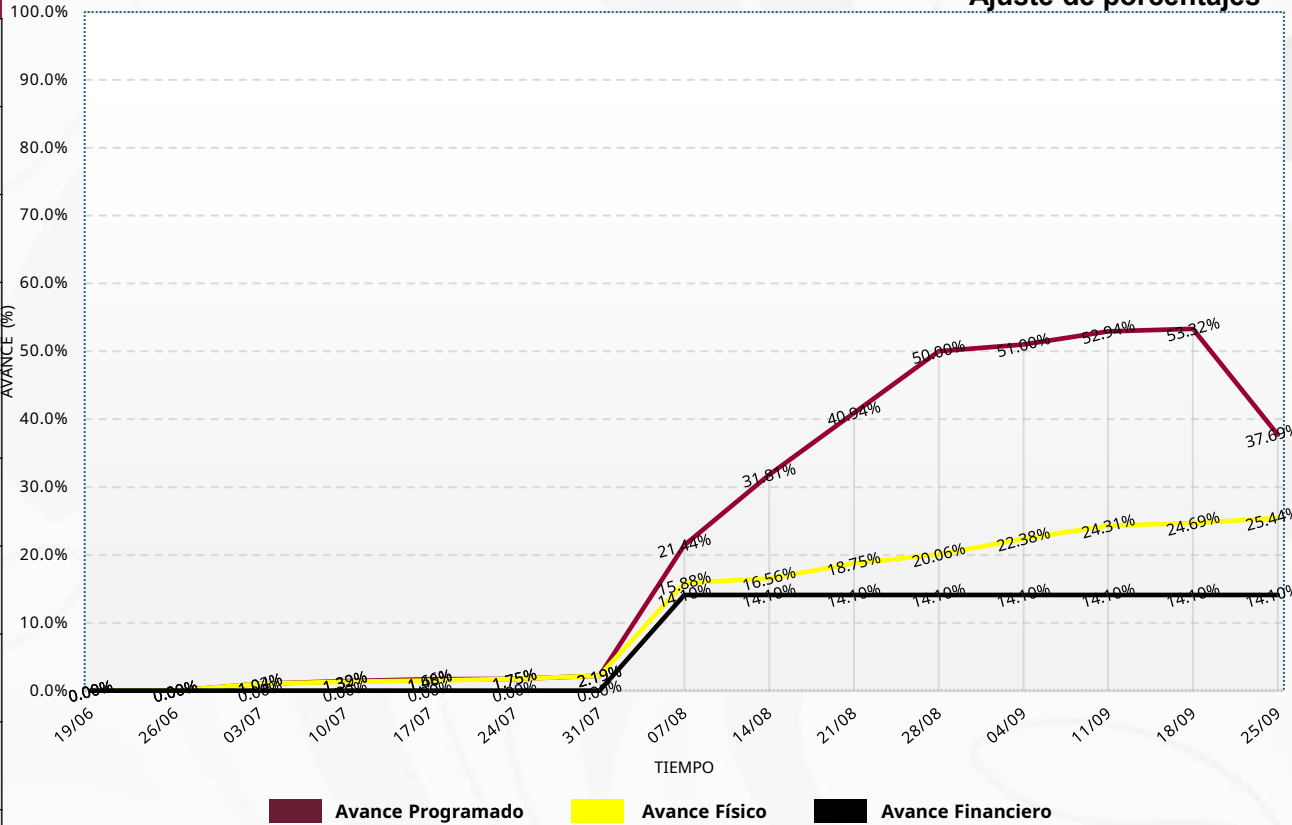

	Del 12 al 18 de septiembre de 2025	Del 19 al 25 de septiembre de 2025
Fuerza de Trabajo (personas)	24	32
Maquinaria	7	7
