

Puente Amado Nervo (Federación) km. 15+680


(Carretera Fed. MEX-200) Nayarit y Jalisco

Avance global

- Programado: 9.38%
- Real: 7.94%
- Semanal: 1.39%
- Financiero: 2.73%

Avance 2025

- Programado: 46.9%
- Real: 39.7%
- Semanal: 7.0%
- Financiero: 8.4%

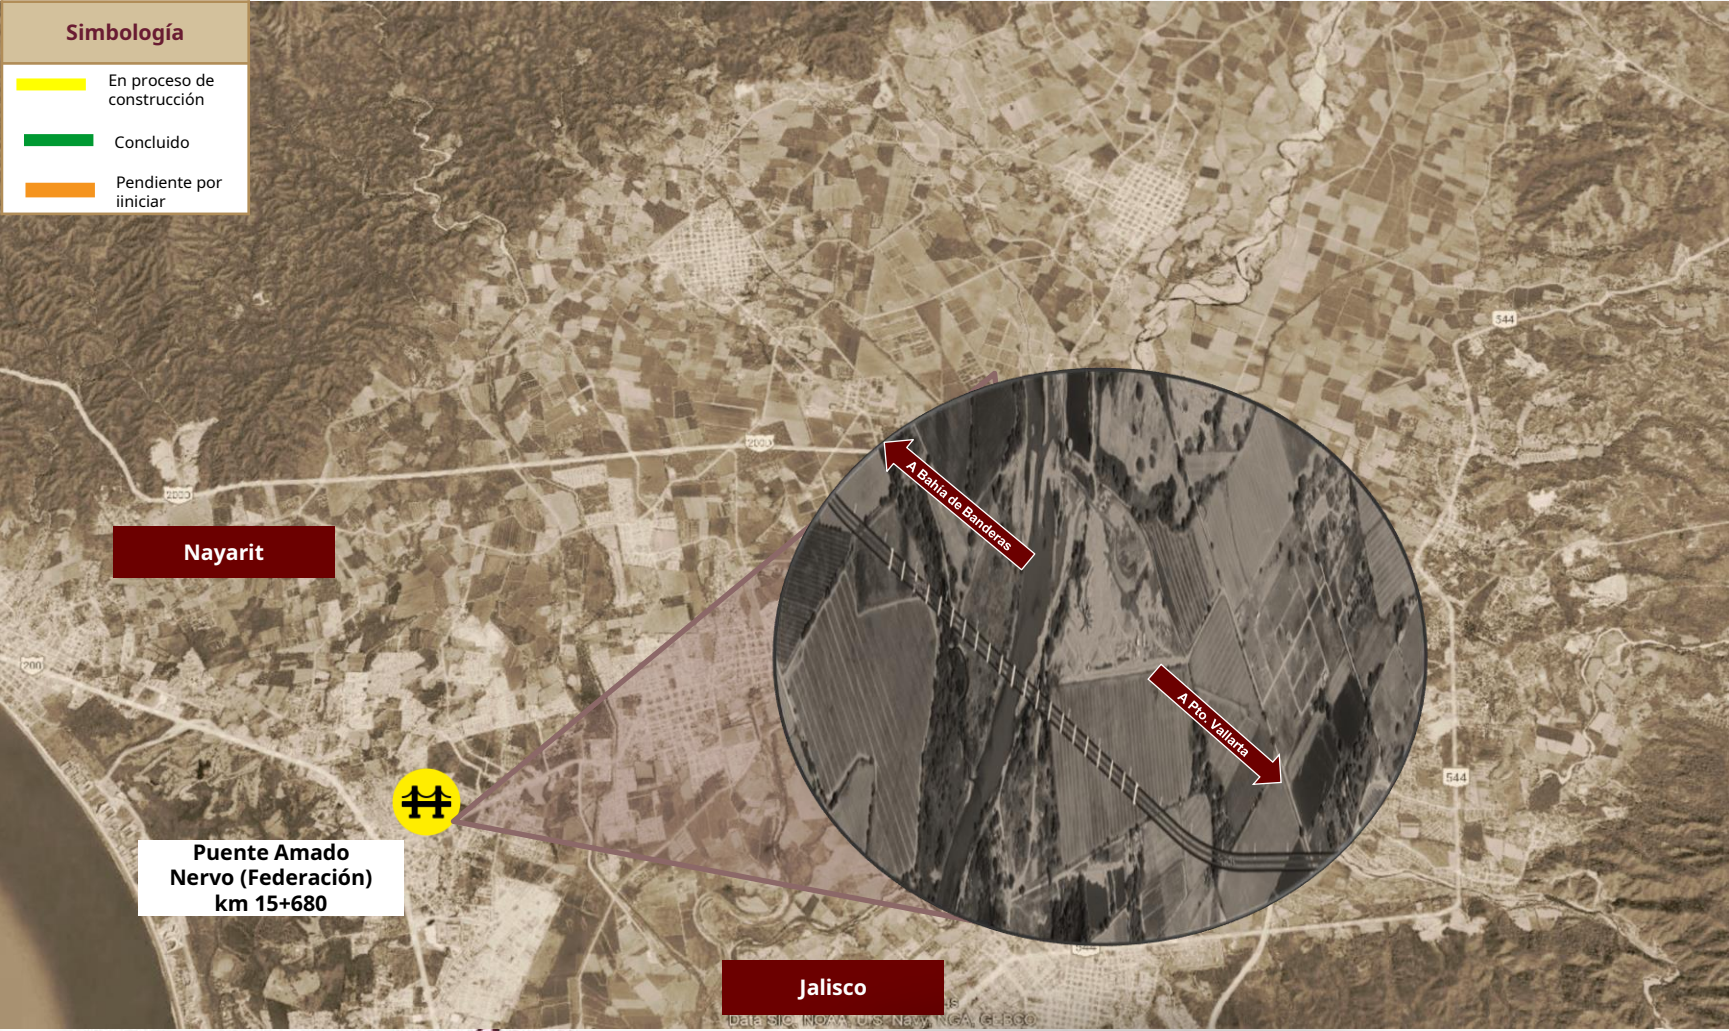

- Inversión total 2025-2026:** 900.0 mdp
Inversión 2025: 200.0 mdp | 0.4 km de Puente
- Meta total:** 1 Puente | 0.798 km
Accesos | 1.222 km
- Inicio:** 14 de julio de 2025
Término: 31 Diciembre de 2026
Termino meta 2025: 31 de diciembre
- 479,471** habitantes beneficiados
- 2,700** empleos generados
- 25 min** ahorro en tiempo


Empresas	
• Contratista:	Regiomontana de Construcción y Servicios, S.A.P.I. de C.V., Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. y JYR Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.
• Supervisión:	Zambrano y Asociados, Ingeniería Civil, S. de R.L. de C.V.

Puente Amado Nervo(Federación) km. 15+680

(Carretera Fed. MEX-200) Nayarit y Jalisco

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 26 al 02/10/25		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
ACCESOS								
Desmonte	Ha.	7.0	0.60	8.6%	6.40	0.50	0	Se inició desmonte lado Jalisco.
Despalme	m3	14,042.0	5,764.00	41.0%	8,278.0	877.6	0	Despalme concluido lado Nayarit
Cortes	m3	10,823.0	0	0.0%	10,823.0	0	0	
Terraplenes	m3	161,117.0	4,670	2.9%	156,447.0	0	1,523	Se continuan trabajos de pedraplén en el lado Nayarit y Jalisco
Base Estabilizada	m3	6,192.0	0	0.0%	6,192.0	0	0	
Carpeta de Concreto Hidráulico	m3	9,687.0	0	0.0%	9,687.0	0	0	
Losas de Acceso	m3	83.0	0	0.0%	83.0	0	0	
INFRAESTRUCTURA								
Pilotes	pza.	126	66	52.4%	60	6.0	10	Se tienen colados 66 pilotes, asimismo se tienen armados 20 pilotes
SUBESTRUCTURA								
Columnas	pza.	126	15	0	111.00	0	12	Se tienen coladas 15 columnas del apoyo 18 y 21
Cabezales	pza.	21	0	0	21	0	0	
SUPERESTRUCTURA								
Trabes tipo NU-220 (fabricación)	pza.	160	0	0.0%	160	0	0	
Trabes tipo NU-220 (montaje)	pza.	160	0	0.0%	160	0	0	
Losas y Diafragmas	m3	4,450.40	0	0.0%	4,450.40	0	0	
Parapeto y Guarnición	m	1,597.00	0	0.0%	1,597.00	0	0	
Obras de Drenaje	pza.	4.00	0	0.0%	4.00	2	0	
PASOS SUPERIORES VEHICULARES								
PSV's	pza.	2.00	0.3	15.0%	1.70	0	0.1	Se trabaja en armado de acero para PSV lado Nayarit.
OBRAS COMPLEMENTARIAS								
Obras Complementarias	lote.	1.00	0	0.0%	1.00	0	0	
SEÑALAMIENTO								
Señalamiento	lote.	1.00	0	0.0%	1.00	0	0	
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD								
Dispositivos de Seguridad	lote.	1.00	0	0.0%	1.00	0	0	

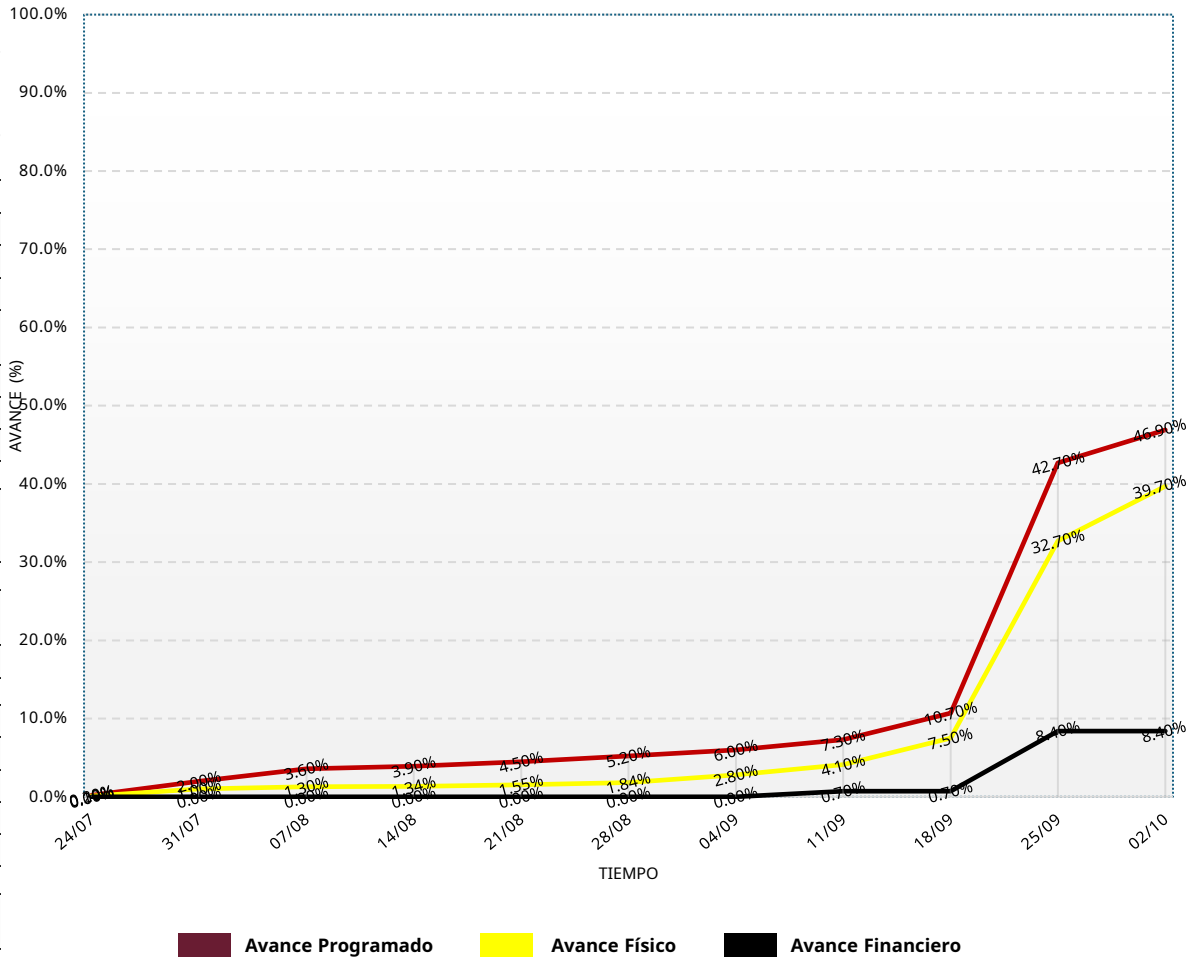

	18 de septiembre al 25 de Septiembre	26 de septiembre al 02 de Octubre
Fuerza de Trabajo (personas)	78	83
Maquinaria	16	16
