

# Puente La Presa Trancas

## Colima

Avance global

• Programado: 12.5 %

• Real: 2.95 %

• Semanal: 0.05 %

• Financiero: 0.0 %


Avance 2025

• Programado: 31.2 %


• Real: 7.38 %

• Semanal: 0.13 %


• Financiero: 0.0 %

 **Inversión total 2025-2026:** 90.0 mdp

**Inversión 2025:** 30.0 mdp


 **Meta total:** 0.15 km


**Meta 2025:** 38.6 % del Puente


 **Fecha de inicio:** 11 de agosto, 2025


**Fecha de término:** 10 de agosto, 2026

**Termino meta 2025:** 31 de diciembre

 **4,053** habitantes beneficiados

 **225** empleos generados

 **15 min** ahorro en tiempo

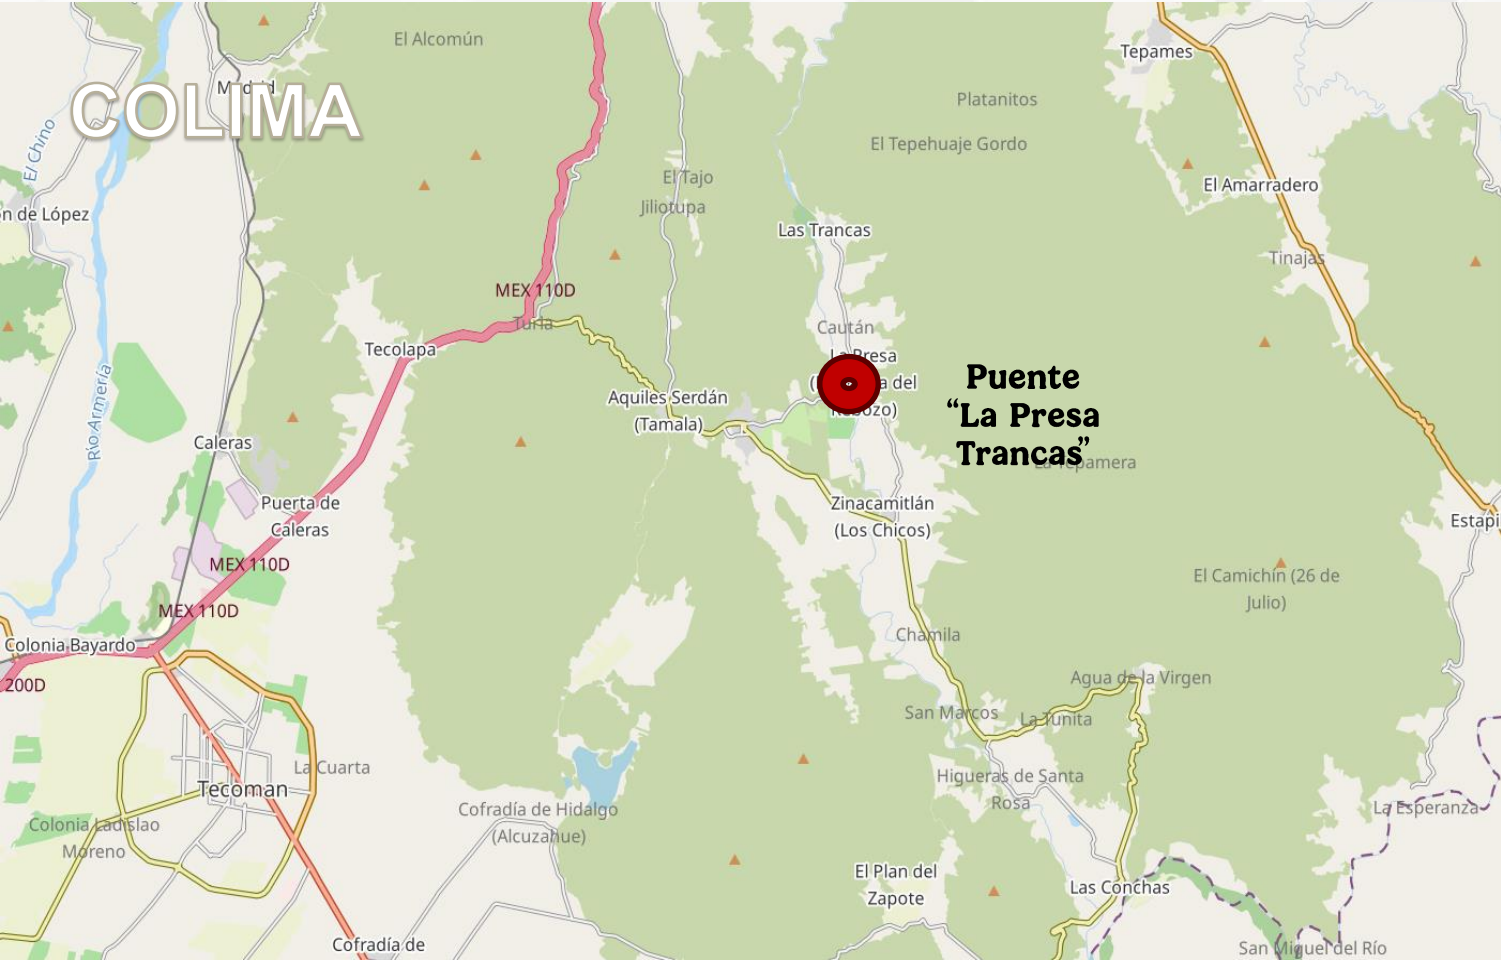

Tramo	Empresas
Construcción del Puente La Presa Trancas	<div><div>• <b>Contratista:</b> GRUPO FIRME DE MÉXICO, S.A DE C.V, CONSTRUCTORA SANTOS CHISUM, S.A DE C.V Y CONSTRUCCIONES Y TERRACERÍAS VANGUARDIA, S.A DE C.V</div><div>• <b>Supervisión:</b> ANMA INGENIERÍA, SA DE CV</div></div>

# Puente La Presa Trancas

## Colima

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	19/09/25 al 25/09/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Preliminares						
Desmonte y Despalme (Ha)	0.83	0.83	0.0	0.0	0.0	
Subestructura						
Perforación (Pza)	26.0	4.0	22.0	7.3	0.0	
Habilitado de acero Pilas (Pza)	26.0	6.0	20.0	6.6	1.0	
Colado de concreto Pilas (Pza)	26.0	0.0	26.0	8.6	0.0	
Habilitado de acero Columnas (Kg)	95,609.0	0.0	95,609.0	0.0	0.0	
Colado de concreto Columnas (m3)	410.0	0.0	410.0	0.0	0.0	
Habilitado de acero Cabezales y Bancos (Kg)	37,426.1	0.0	37,426.1	0.0	0.0	
Colado de concreto Cabezales y Bancos (m3)	237.6	0.0	237.45	0.0	0.0	
Superestructura						
Diafragma (m3)	130.3	0.0	130.3	0.0	0.0	
Trabes pretensadas AASHTO TIPO VI (Pza)	45.0	0.0	45.0	0.0	0.0	
Montaje de trabes pretensadas AASHTO TIPO VI (Pza)	45.0	0.0	45.0	0.0	0.0	
Losa (m3)	648.0	0.0	648.0	0.0	0.0	
Carpeta asfáltica (m3)	166.8	0.0	166.8	0.0	0.0	

