

PSV Arco Norte Colima

Avance global

• Programado: 12.68%

• Real: 18.60%

• Semanal: 1.62%

• Financiero: 11.05%


Avance 2025

• Programado: 37.17%


• Real: 54.54%

• Semanal: 4.75%


• Financiero: 32.40%

 **Inversión total 2025-2026:** 369.7 mdp

Inversión 2025: 127.4 mdp


 **Meta total:** 590 m longitud total, 298 m estructura, 292 m accesos.


Meta 2025: 298 m subestructura


 **Inicio:** 10 de junio de 2025


Término: 09 de junio de 2026

Término meta 2025: diciembre

 **306,810** habitantes beneficiados

 **1,109** empleos generados

 **15 min** ahorro en tiempo

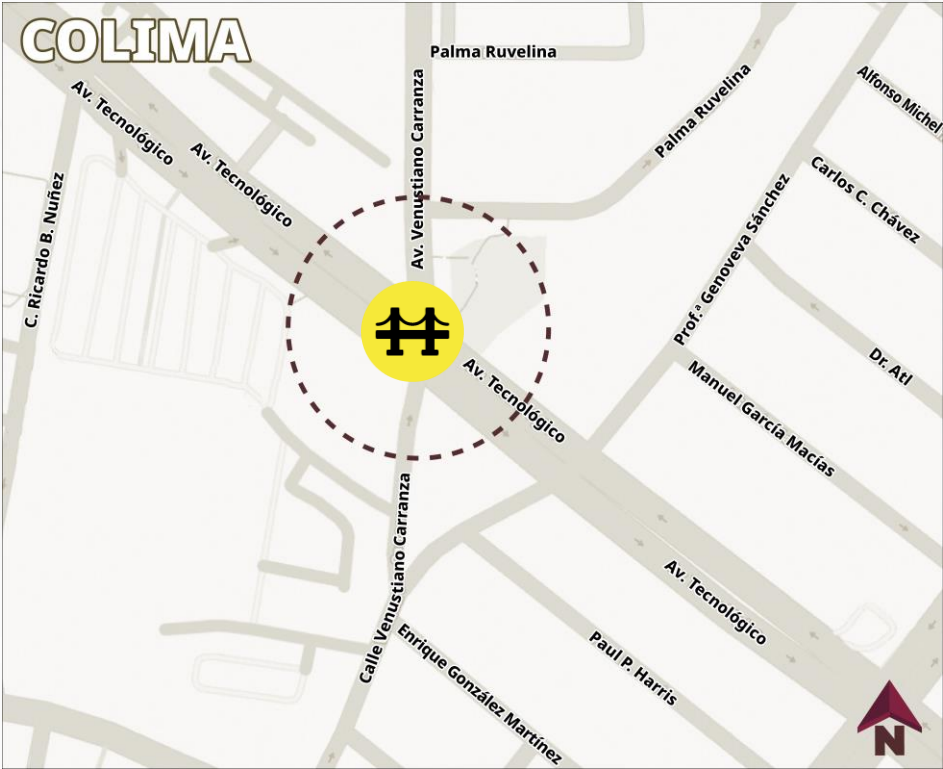

Nivel de Servicio C



Situación actual

Nivel de Servicio en estudio



Proyecto

Tramo	Empresas
Construcción del Paso Superior Vehicular "Arco Norte"	• Contratista: IDEVSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V Y CONSORCIO CONTINENTAL DE INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V
	• Supervisión: JUVISA, INGENIERÍA, S.A DE C.V

PSV Libramiento Arco Norte

Colima




**Gobierno de
México**

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	26/09/25 al 02/10/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos diversos						
Desmantelamiento de dispositivos existentes (pza)	530.0	530.00	0.00	0.00	0.00	Concluido
Demolición (m)	350.0	350.00	0.00	0.00	0.00	Concluido
Red de media tensión subterránea (m)	2,100.0	2,100.00	0.00	0.00	0.00	Concluido
Reubicación acueducto 36" (m)	736.0	736.00	0.00	0.00	0.00	Concluido
Terracerías						
Corte (m³)	9,295.00	0.00	9,295.00	0.00	0.00	
Terraplén (m³)	9,292.00	0.00	9,292.00	0.00	0.00	
Subyacente (m³)	3,233.00	0.00	3,233.00	0.00	0.00	
Subrasante (m³)	4,706.00	0.00	4,706.00	0.00	0.00	
Subestructura						
Pilas (pza)	66.00	33.00	33.00	3.30	0.00	
Zapatas (pza)	20.00	10.00	10.00	1.00	2.00	
Columnas (pza)	42.00	17.00	25.00	2.10	2.00	
Cabezales (pza)	22.00	3.00	19.00	1.10	1.00	

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

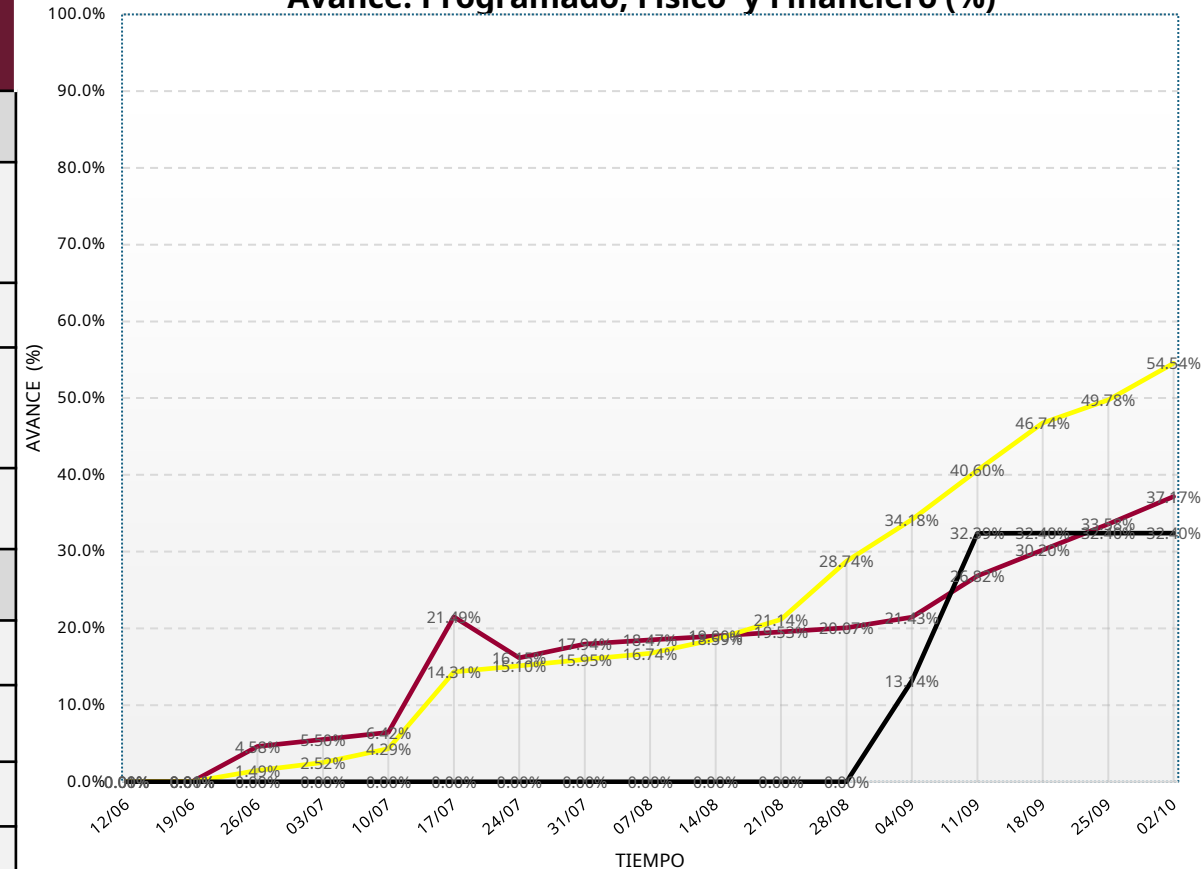

Avance Programado

Avance Físico

Avance Financiero

	19 de septiembre al 25 de septiembre	26 de septiembre al 02 de octubre
Fuerza de Trabajo (personas)	77	80
Maquinaria	14	14
