

# PSF Arco Sur


## Colima

**Avance global**


- Programado: 4.62%
- Real: 19.90%
- Semanal: 3.22%
- Financiero: 4.76%


**Avance 2025**


- Programado: 9.99%
- Real: 43.05%
- Semanal: 6.97%
- Financiero: 9.97%


 **Inversión total 2025-20265:** 575.4 mdp  
**Inversión 2025:** 227.4 mdp

 **Meta total:** 1.2 km (puente y accesos)  
**Meta 2025:** 0.55 km (**46% del puente (cimentación y subestructura)**)

 **Inicio:** 03-Julio de 2025  
**Término:** Julio de 2026  
**Término meta 2025:** Diciembre

 **157,048** habitantes beneficiados

 **1,431** empleos generados


 **15 min** ahorro en tiempo

Tramo	Empresas
PSF Arco Sur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contratista: COCONAL S.A P. I DE C.V</li><li>• Supervisión: DITAPSA CONSULTORES, S.A DE C.V</li></ul>



Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

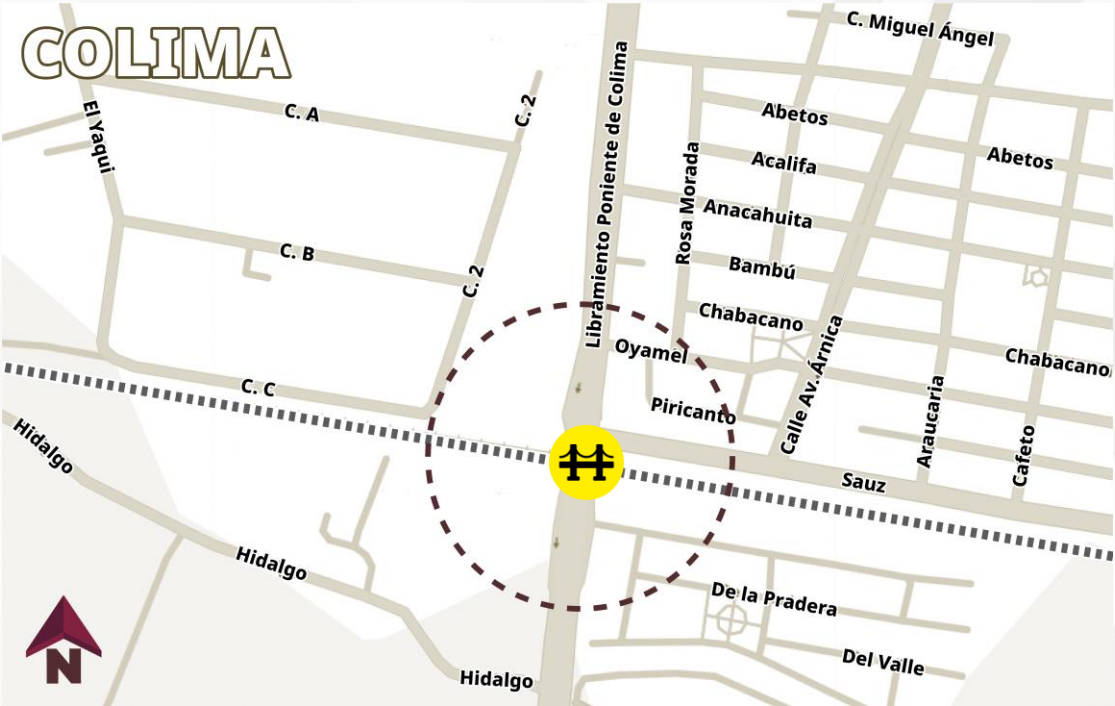

# PSF Arco Sur Colima

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	19/09/25 al 25/09/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos diversos (pzs)	254.0	86.64	167.36	16.76	0.0	
Reubicación de obras inducidas (m)	2,477.55	2, 032.36	445.19	106.27	0.0	
Construcción de cruce prov. FFCC (pza)	223.00	160.0	63	0.00	0.33	
Losa plana para mantenimiento CONAGUA (m3)	80.03	0.00	80.03	0.00	0.00	
SUBESTRUCTURA PUENTE LATERAL						
Pilas (pza)	4.00	0.00	4.00	0.47	0.00	
Cabezales (pza)	2.00	0.00	2.00	0.12	0.00	
Accesos (m3)	210.02	0.72	209.30	1.77	0.00	
Superestructura puente lateral (pza)	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
Adecuación lateral no. 1 (m3)	994.56	898.08	96.48	0.00	195.05	
Adecuación lateral no. 2 (m3)	790.42	135.43	654.99	0.50	0	
Accesos al PSF (m)	896.00	12.28	883.72	5.17	3.69	

