

# PSF Arco Sur


## Colima

**Avance global**


- Programado: 6.11%
- Real: 23.19%
- Semanal: 3.26%
- Financiero: 11.61%


**Avance 2025**


- Programado: 13.22%
- Real: 50.10%
- Semanal: 7.05%
- Financiero: 23.34%

 **Inversión total 2025-20265:** 575.4 mdp  
**Inversión 2025:** 227.4 mdp

 **Meta total:** 1.2 km (puente y accesos)  
**Meta 2025:** 0.55 km (**46% del puente (cimentación y subestructura)**)

 **Inicio:** 03-Julio de 2025  
**Término:** Julio de 2026  
**Término meta 2025:** Diciembre

 **157,048** habitantes beneficiados

 **1,431** empleos generados


 **15 min** ahorro en tiempo

Tramo	Empresas
PSF Arco Sur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contratista: COCONAL S.A P. I DE C.V</li><li>• Supervisión: DITAPSA CONSULTORES, S.A DE C.V</li></ul>




Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

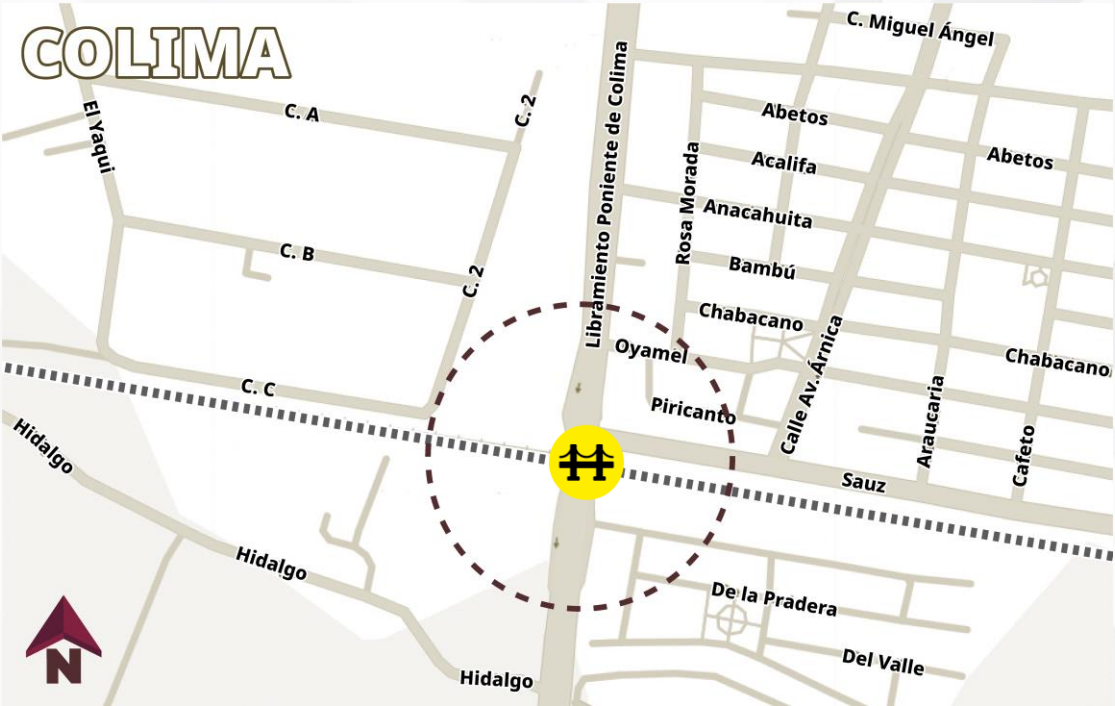

# PSF Arco Sur Colima

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

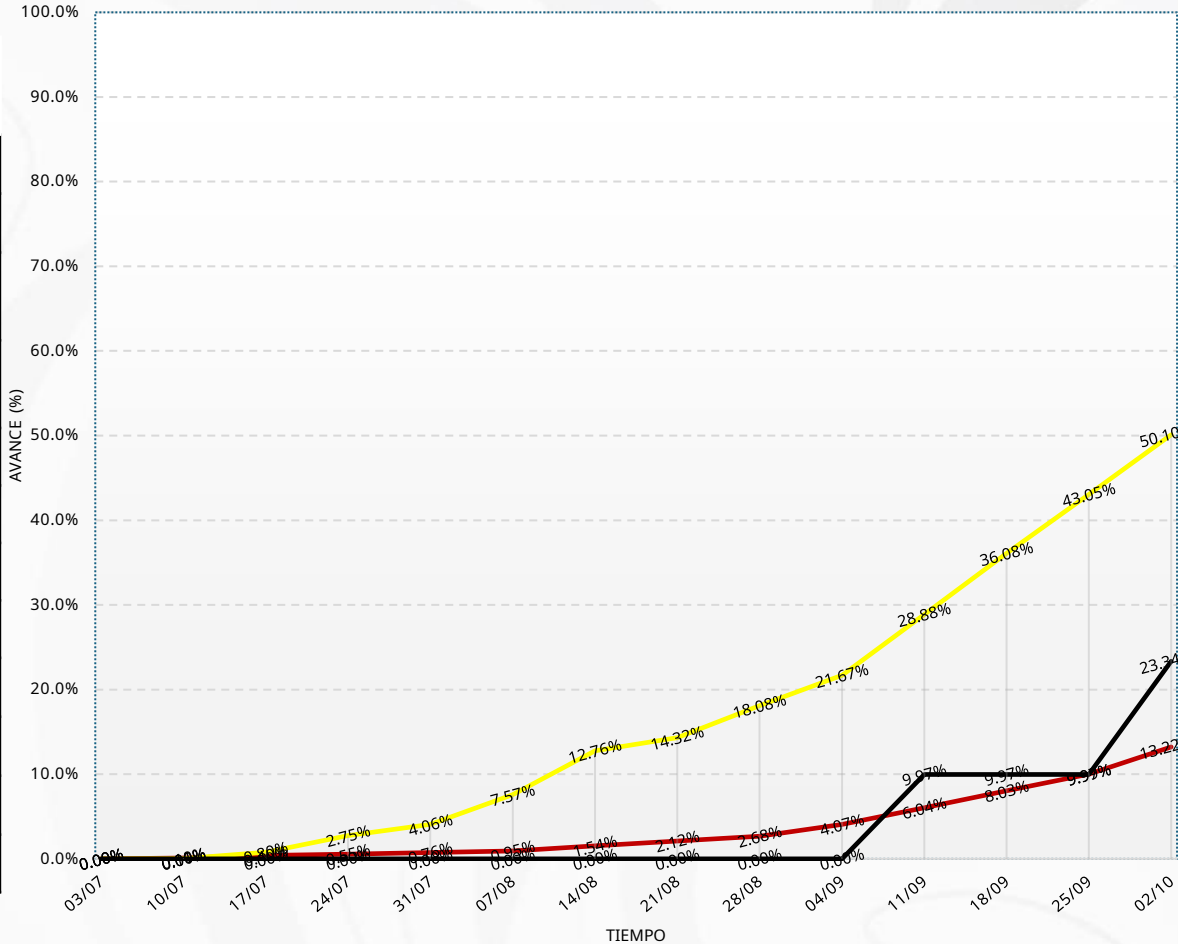

	19 de septiembre al 25 de septiembre	26 de septiembre al 02 de octubre
Fuerza de Trabajo (personas)	257	206
Maquinaria	43	43
