

Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)



Gobierno de
México


Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global

- Programado: 21.56%
- Semanal: 0.12%
- Real: 12.64%
- Financiero: 2.86%

Avance 2025

- Programado: 71.87%
- Semanal: 0.4%
- Real: 42.13%
- Financiero: 6.9%

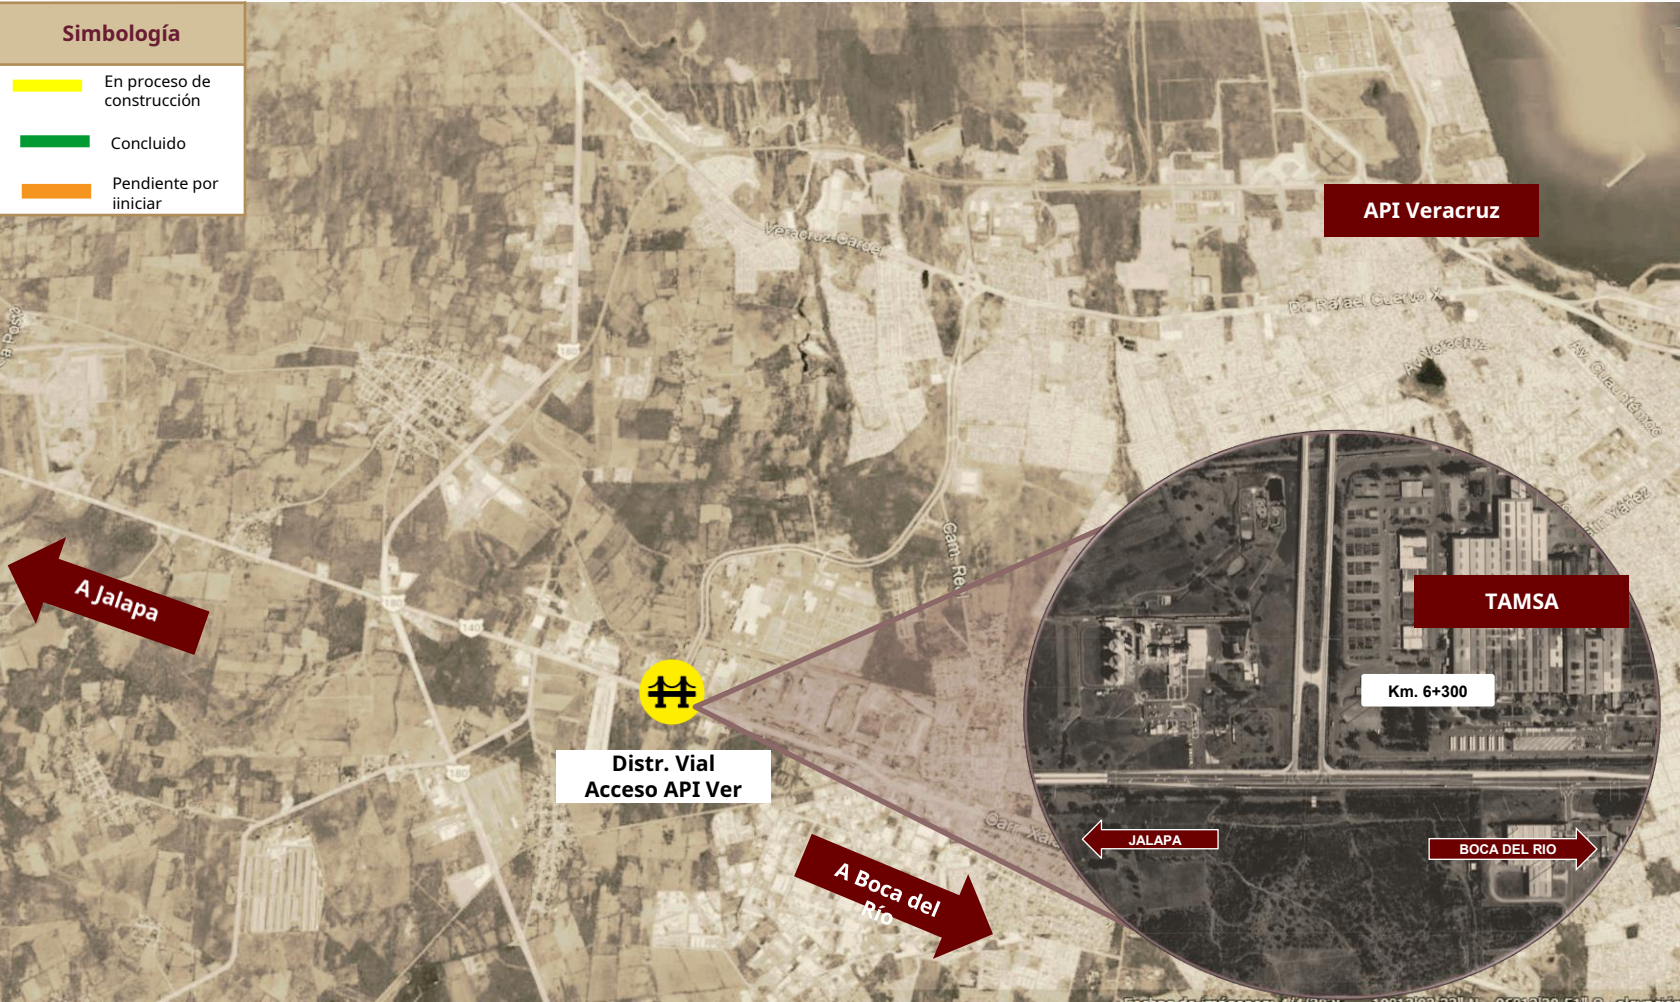

- Inversión total 2025-2026: 840 mdp**
Inversión 2025: 326 mdp | 0.6 km de PSV
Nota: Los 840.0 mdp corresponden a la asignación para esta obra en la autorización de contratación plurianual.
- Meta total 2025-2026: 1.97 km**
1 PSV: 0.872 km
Accesos: 0.532 km
Transiciones: 0.566 km
Nota: Los 1.97 km corresponden a la longitud total autorizada en el proyecto, desglosada como se indica.
- Inicio:** 14 de julio de 2025
Término: Diciembre de 2026
Termino meta 2025: Diciembre
- 780,441** habitantes beneficiados
- 2,235** empleos generados
- 25 min** ahorro en tiempo

Empresas


- **Contratista:** ALZ Construcciones S.A. de C.V.
- **Supervisión:** GV Ingeniería, S.A. de C.V.

Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)

Cuerpo B (programa 2025)

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado		Faltante	Ejecutado del 26 al 02/10/25		Observaciones
						Programado	Ejecutado	
TERRACERÍAS								
Desmonte	Ha	4.10	4.10	100%	0.00	0.00	0.00	Concluido en el cpo B
Despalme	m³	6,295.00	5,526.0	87.8%	769.00	769.00	0.00	
Obra Inducida	Lote	1	0	0	1	0.00	0.00	
Excavaciones	m³	49,951.00	13,572	27.2%	36,379.00	18,189.50	2,807.00	
Terraplenes	m³	36,650.00	3,713	10.1%	32,937.00	5,489.50	808.00	
Muro Mecánicamente Estabilizado	m³	1,531.00	0	0.0%	1,531.00	306.20	0.00	
Terraplenes en Rampa	m³	4,384.00	0	0.0%	4,384.00	876.80	0.00	
Pavimentos asfálticos	m³	3,090.00	0	0.0%	3,090.00	0.00	0.00	
Paraderos	pza.	1.00	0	0.0%	1.00	0.00	0.00	
INFRAESTRUCTURA								
Pilotes	pza.	132	132	100.0%	0	0	0	Concluido en el cpo B
Zapatas	pza.	21	14	66.7%	7	7	3	
SUBESTRUCTURA								
Columnas (pza)	pza.	21	12	57.1%	9.00	5	2	En proceso de armado 2 columnas adicionales
Cabezales	pza.	23	0	0.0%	23.00	3	0	
SUPERESTRUCTURA								
Trabes tipo AASHTO VI	pza.	132	5	3.8%	127.00	16	0	Se tiene habilitado el acero de 15 trabes en total
Montaje de trabes	pza.	132	0	0.0%	132.00	0	0	
Diafragmas	pza.	110	0	0.0%	110.00	0	0	
Losa (claro)	m³	1,723.00	0	0.0%	1,723.00	0.0	0.0	

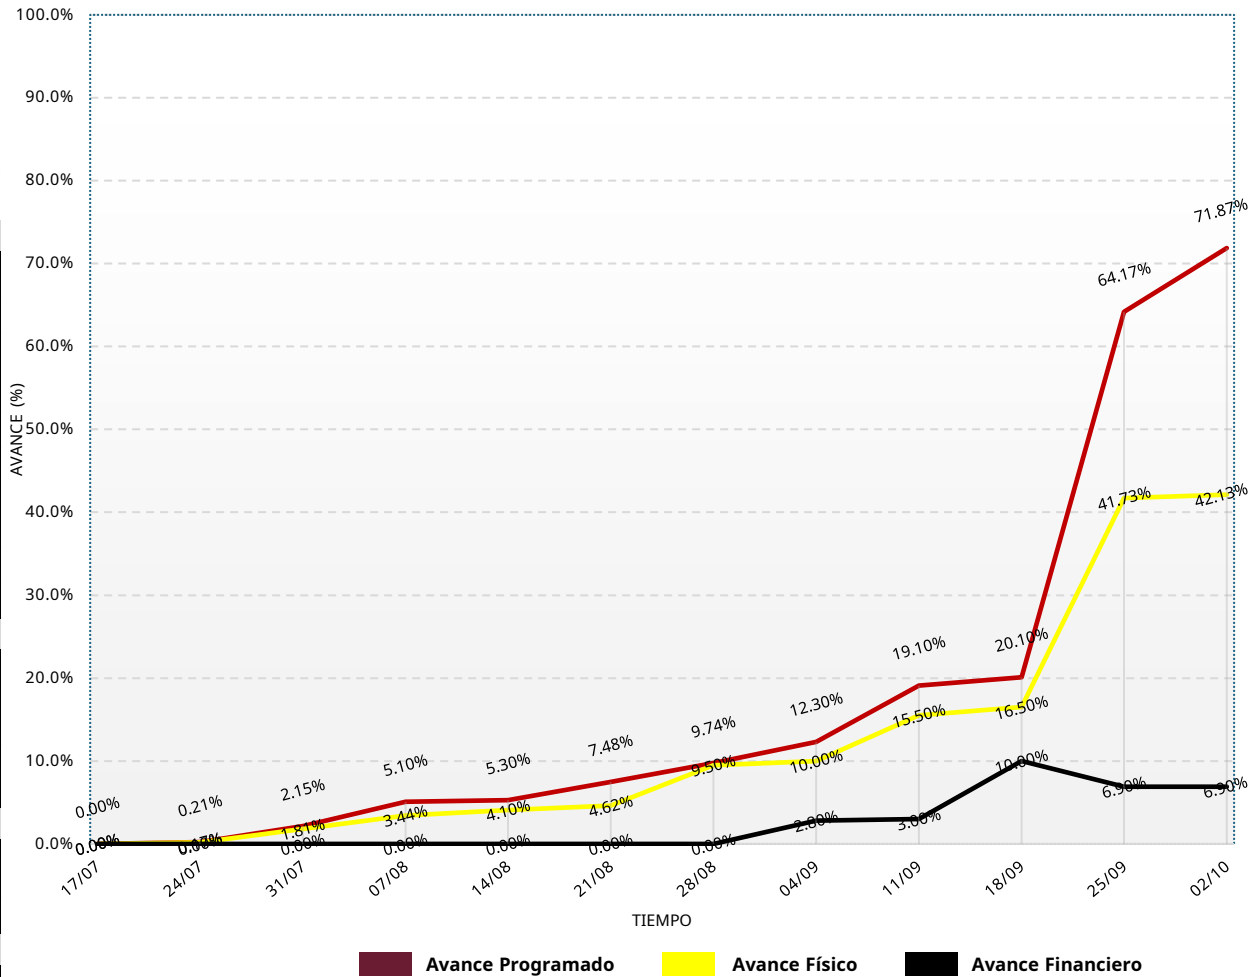

	19 de septiembre al 25 de Septiembre	26 de septiembre al 02 de Octubre
Fuerza de Trabajo (personas)	101	111
Maquinaria	24	24

Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)

Cuerpo A (programa 2026)

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado		Faltante	Ejecutado del 26 al 02/10/25		Observaciones
						Programado	Ejecutado	
TERRACERÍAS								
Desmonte	Ha	4.07	0.00	0.0%	4.07	0.00	0.00	Programa 2026
Despalme	m³	6,292.00	0.0	0.0%	6,292.00	0.00	0.00	Programa 2026
Obra Inducida	Lote	1	0	0	1	0.00	0.00	Programa 2026
Excavaciones	m³	49,951.00	0	0.0%	49,951.00	0.00	0.00	Programa 2026
Terraplenes	m³	36,650.00	0	0.0%	36,650.00	0.00	0.00	Programa 2026
Muro Mecánicamente Estabilizado	m³	1,530.00	0	0.0%	1,530.00	0.00	0.00	Programa 2026
Terraplenes en Rampa	m³	4,385.00	0	0.0%	4,385.00	0	0	Programa 2026
Pavimentos asfálticos	m³	3,090.00	0	0.0%	3,090.00	0	0	Programa 2026
Paraderos	pza.	1.00	0	0.0%	1.00	0	0	Programa 2026
INFRAESTRUCTURA								
Pilotes	pza.	132	0	0.0%	132	0	0	Programa 2026
Zapatas	pza.	21	0	0.0%	21	0	0	Programa 2026
SUBESTRUCTURA								
Columnas (pza)	pza.	23	0	0.0%	23.00	0	0	Programa 2026
Cabezales	pza.	23	0	0.0%	23.00	0	0	Programa 2026
SUPERESTRUCTURA								
Trabes tipo AASHTO VI	pza.	132	0	0.0%	132.00	0	0	Programa 2026
Montaje de trabes	pza.	132	0	0.0%	132.00	0	0	Programa 2026
Diafragmas	pza.	110	0	0.0%	110.00	0	0	Programa 2026
Losa (claro)	m³	1,723.00	0	0.0%	1,723.00	0	0	Programa 2026
