

# Puente El Chical

## Colima

**Avance global**

• Programado: 8.3 %

• Real: 6.3 %

• Semanal: 2.9 %

• Financiero: 0.0 %


**Avance 2025**


• Programado: 36.5 %


• Real: 27.7 %


• Semanal: 13.0%


• Financiero: 0.0%


 **Inversión total 2025-2026:** 110 mdp  
**Inversión 2025:** 20.6 mdp


 **Meta total:** 0.27 km  
**Meta 2025:** 22.8 % del Puente

 **Fecha de inicio:** 11 de agosto, 2025  
**Fecha de término:** 10 de agosto, 2026  
**Termino meta 2025:** 31 de diciembre, 2025

 **4,053** habitantes beneficiados

 **330** empleos generados

 **15 min** ahorro en tiempo

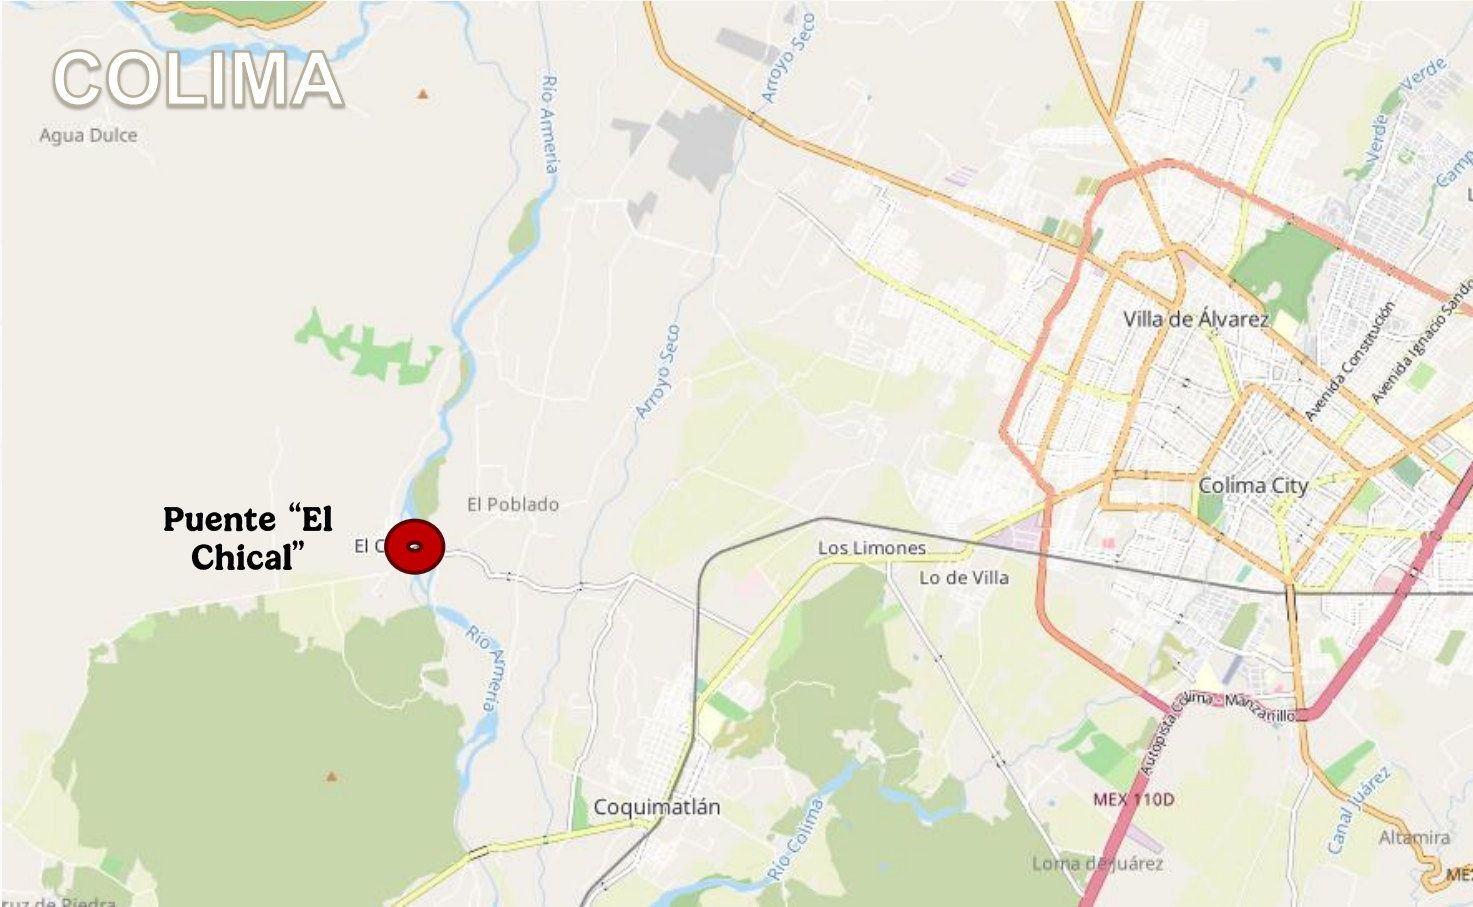

Tramo	Empresas
Construcción Puente El Chical	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Contratista:</b> TRITURADOS Y ASFALTOS DE ATLACOMULCO, S.A DE C.V Y GUCOC, S.A DE C.V</li><li>• <b>Supervisión:</b> ---</li></ul>

# Puente El Chical

## Colima

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	19/09/25 al 25/09/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Resumen de Obra						
Limpieza, Trazo y Nivelación (m2)	9,784.0	9,784.0	0.0	0.0	0.0	
Pilas de cimentación (Pza)	30.0	10.0	20.0	3	3.5	
Columnas (Pza)	24.0	0.0	24.0	0.0	0.0	
Construcción de cabezales y bancos (m3)	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	
Trabes AASHTO VI (Pza)	45.0	0.0	45.0	0.0	0.0	
Montaje de trabes (Pza)	45.0	0.0	45.0	0.0	0.0	
Colado de diafragma y losa (m3)	648.0	0.0	648.0	0.0	0.0	
Carpeta Asfáltica (m3)	166.8	0.0	166.8	0.0	0.0	
Guarniciones y banquetas (m)	720.0	0.0	720.0	0.0	0.0	
Accesos, señalamiento y obras complementarias (m)	139.0	0.0	139.0	0.0	0.0	
Conformación de camino de desvío y dragado del cauce (m3)	125,000.0	10,000.0	115,000.0	2,600	2,600	

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

