

Distribuidor Vial Santa Ana Tlaxcala

Avance global

• Programado: 4.53%

• Real: 6.90%

• Semanal: 1.50%

• Financiero: 3.60%


Avance 2025


• Programado: 32.36%


• Real: 49.29%


• Semanal: 10.72%


• Financiero: 25.71%


 **Inversión total 2025-2026:** 650 mdp
Inversión 2025: 100 mdp | 14% de 1 Distribuidor Vial

 **Meta total:** 1 Distribuidor | **1.204 km** (0.654 km estructura, 0.177 km rampa de entrada, 0.118 km rampa salida y 0.255 km fresado y carpeta en accesos)


 **Inicio:** 16 de julio de 2025
Término: 31 de diciembre de 2026
Termino meta 2025: 31 de diciembre

 **73,215** habitantes beneficiados

 **1,950** empleos generados

 **20 min** ahorro en tiempo


Tramo	Empresas
KM 29+420 AL KM 30+028	<div><div>• Contratista: PROACON MÉXICO, S.A. DE C.V. - CONSTRUCCIONES ALDESEM, S.A. DE C.V. - CONSORCIO DE INGENIEROS</div><div>• CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V.,</div><div>• Supervisión URBA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</div></div>

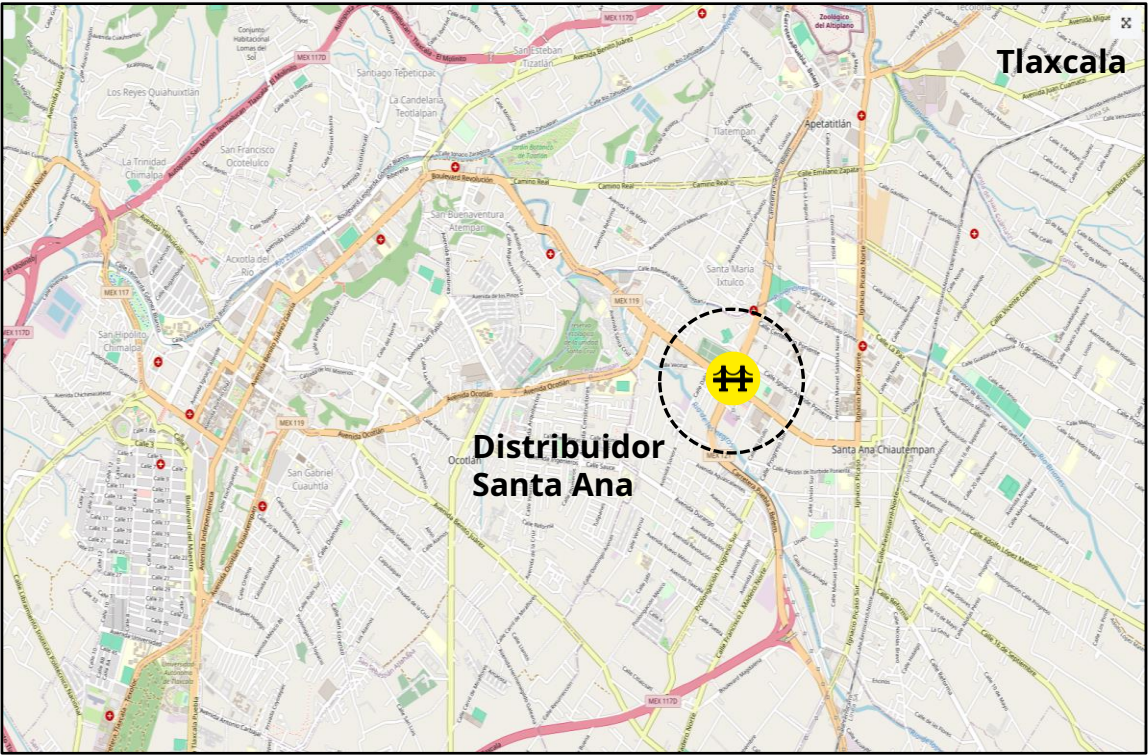

Distribuidor Vial Santa Ana

Tlaxcala

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

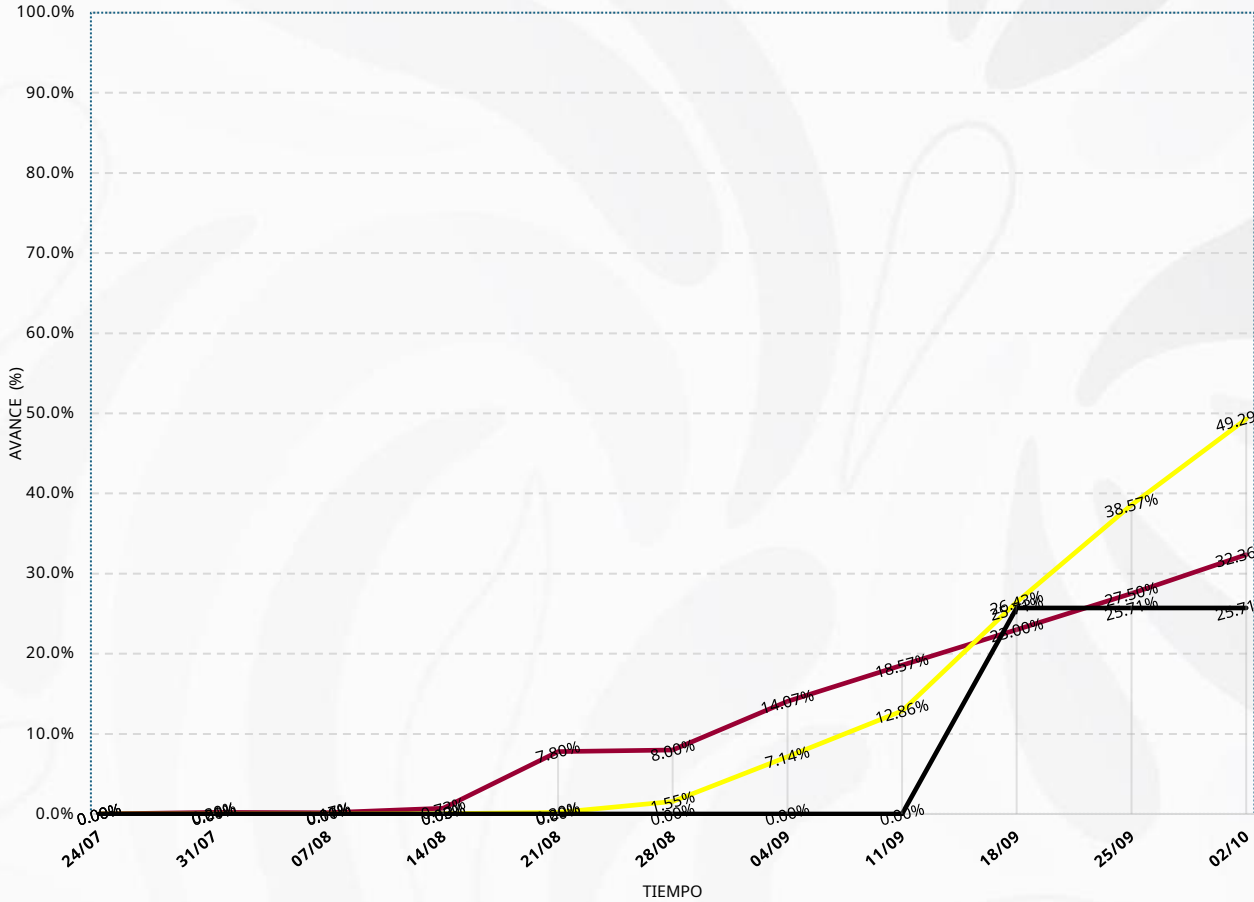

	Avance Programado	Avance Físico	Avance Financiero
	19 al 25 de septiembre		26 de septiembre al 02 de octubre
Fuerza de Trabajo (personas)	100		121
Maquinaria	22		23
