

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez
Sinaloa



Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global

- Programado: 1.59%
- Real: 19.06%
- Semanal: 6.52%
- Financiero: 7.04%

Avance 2025

- Programado: 3.18%
- Semanal: 13.02%
- Real: 38.12%
- Financiero: 12.6%



Inversión total 2025-2026: 380.0 mdp
Inversión 2025: 200.0 mdp | (50% de PSV)



Meta total: PSV | 0.811 km longitud total

Nota: Se trata de un proyecto integral (donde la contratista elabora también el proyecto ejecutivo). Al contar ya con un proyecto conceptual completo a la fecha, la longitud total del proyecto es de 0.811 km incluyendo los accesos y las transiciones.



Inicio: 18 de agosto de 2025

Término: Agosto 2026

Término meta 2025: Diciembre



862,037 Habitantes beneficiados




1,140 empleos generados



20 min ahorro en tiempo

Empresas

- Contratista: ESMA Instalaciones, S.A. de C.V.
- Supervisión: Constructora y Supervisora GESCO, S.A. de C.V.

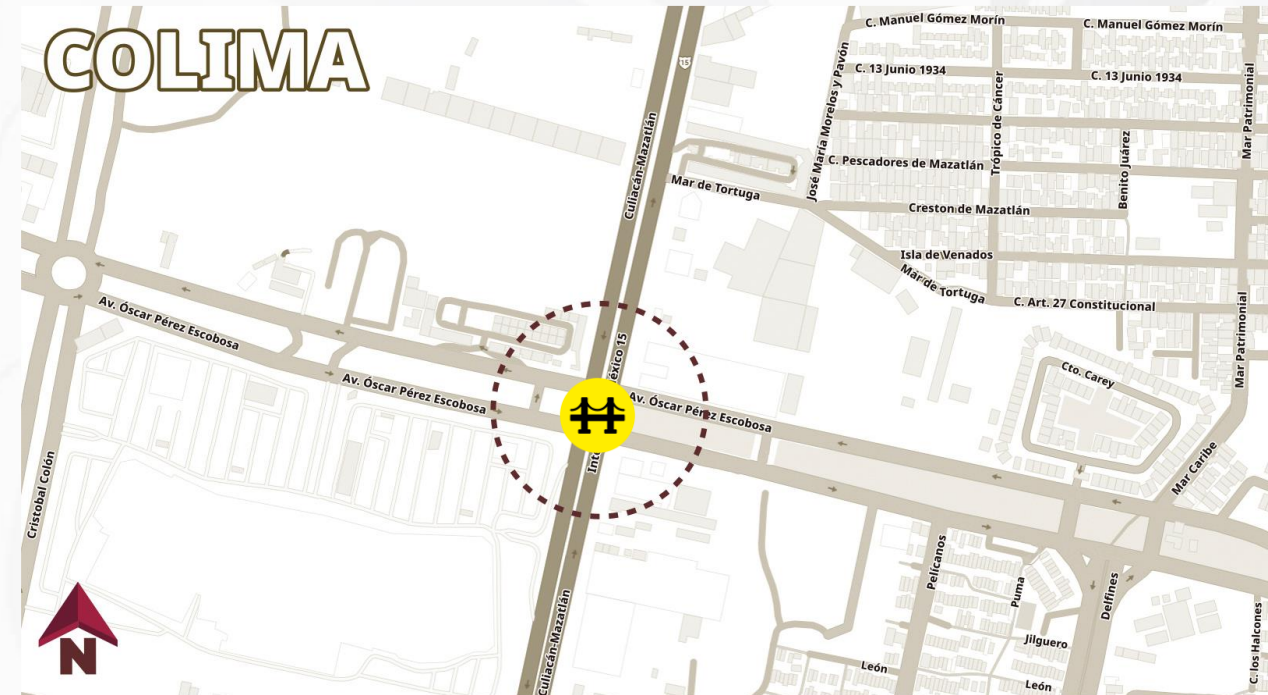


Nivel de Servicio C



Situación actual

Nivel de Servicio en estudio

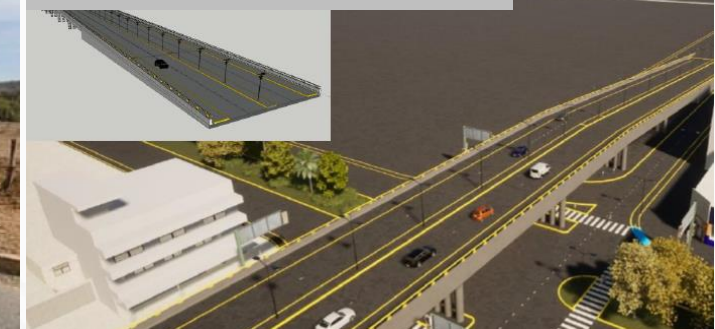


Proyecto

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez Sinaloa

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado		Faltante	Ejecutado del 26 al 02/10/25		Observaciones
						Programado	Ejecutado	
PRECIO ALZADO								
Estudios y Proyecto Ejecutivo	Actividad	2	1.4	70.0%	0.6	0.1	0.3	Se continua trabajos de sondeos
Cimentación	Apoyo	9	7.7	85.6%	1.3	1.3	0.7	Se tiene un total de 23 pilotes concluidos
Columnas y Cabezales	Apoyo	9	2.0	22.2%	7.0	0	2.0	
Superestructura Fabricación de Trabes AASHTO IV	Actividad	8	2	25.0%	6	0	1.5	
Superestructura Montaje de Trabes AASHTO IV	pieza	77	0	0.0%	77	0	0	
Superestructura Fabricación de Trabes Nebrazka NU240	pieza	11	0	0.0%	11	0	0	
Superestructura Montaje de Trabes Nebrazka NU240	pieza	11	0	0.0%	11	0	0	
Muro Mecánicamente estabilizado (Frabricacion de Escamas)	Actividad	1	0.1	10.0%	1	0	0	
Muro Mecánicamente estabilizado (Colocacion de Escamas)	Actividad	1	0	0.0%	1	0	0	
Muro Mecánicamente estabilizado Relleno	Actividad	1	0	0.0%	1	0	0	
Losa de concreto Hidráulico	pieza	4	0	0.0%	4	0	0	
Pavimento de concreto Hidráulico	Actividad	2	0	0.0%	2	0	0	
Alumbrado	Actividad	2	0	0.0%	2	0	0	
Señalamiento	Actividad	2	0	0.0%	2	0	0	
Semaforización	Actividad	1	0	0.0%	1	0	0.0	
PRECIO UNITARIO								
Terraplenes	m3	5,032.00	0	0.0%	5,032.00	0	0	
Base Hidráulilca	m3	3,992.00	0	0.0%	3,992.00	0	0	
Riego de impregnación	m2	20,330.00	0	0.0%	20,330.00	0	0	
Fresado de superficie	m2	23,420.00	0	0.0%	23,420.00	0	0	
Banqueta	m2	6,922.00	0	0.0%	6,922.00	0	0	
Relleno	m3	692.00	0	0.0%	692.00	0	0	

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

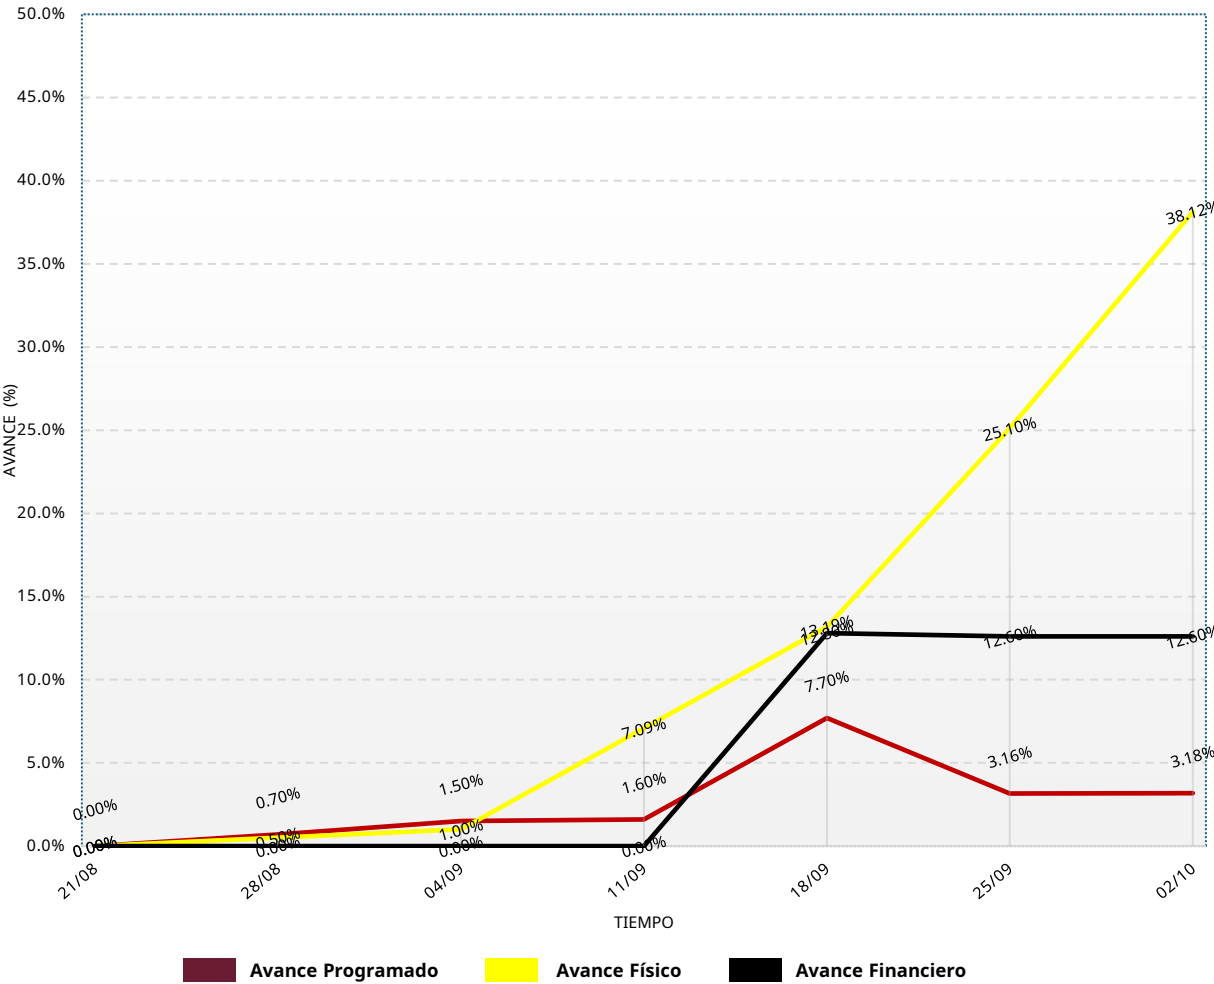

	Del 19 al 25 de septiembre de 2025	Del 26 de septiembre al 2 de octubre
Fuerza de Trabajo (personas)	130	145
Maquinaria	10	14
