

Puente Amado Nervo (Federación) km. 15+680

(Carretera Fed. MEX-200) Nayarit y Jalisco



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes


Nota: el avance 2025 real reportado por esta SOR II la semana pasada fue de 26.5%, el correspondiente a esta semana es de 32.7%, por lo que el avance semanal es de 6.2%.

Avance global

- Programado: 8.55%
- Real: 6.55%
- Semanal: 1.25%
- Financiero: 2.73%

Avance 2025

- Programado: 42.7%
- Real: 32.7%
- Semanal: 6.2%
- Financiero: 8.4%

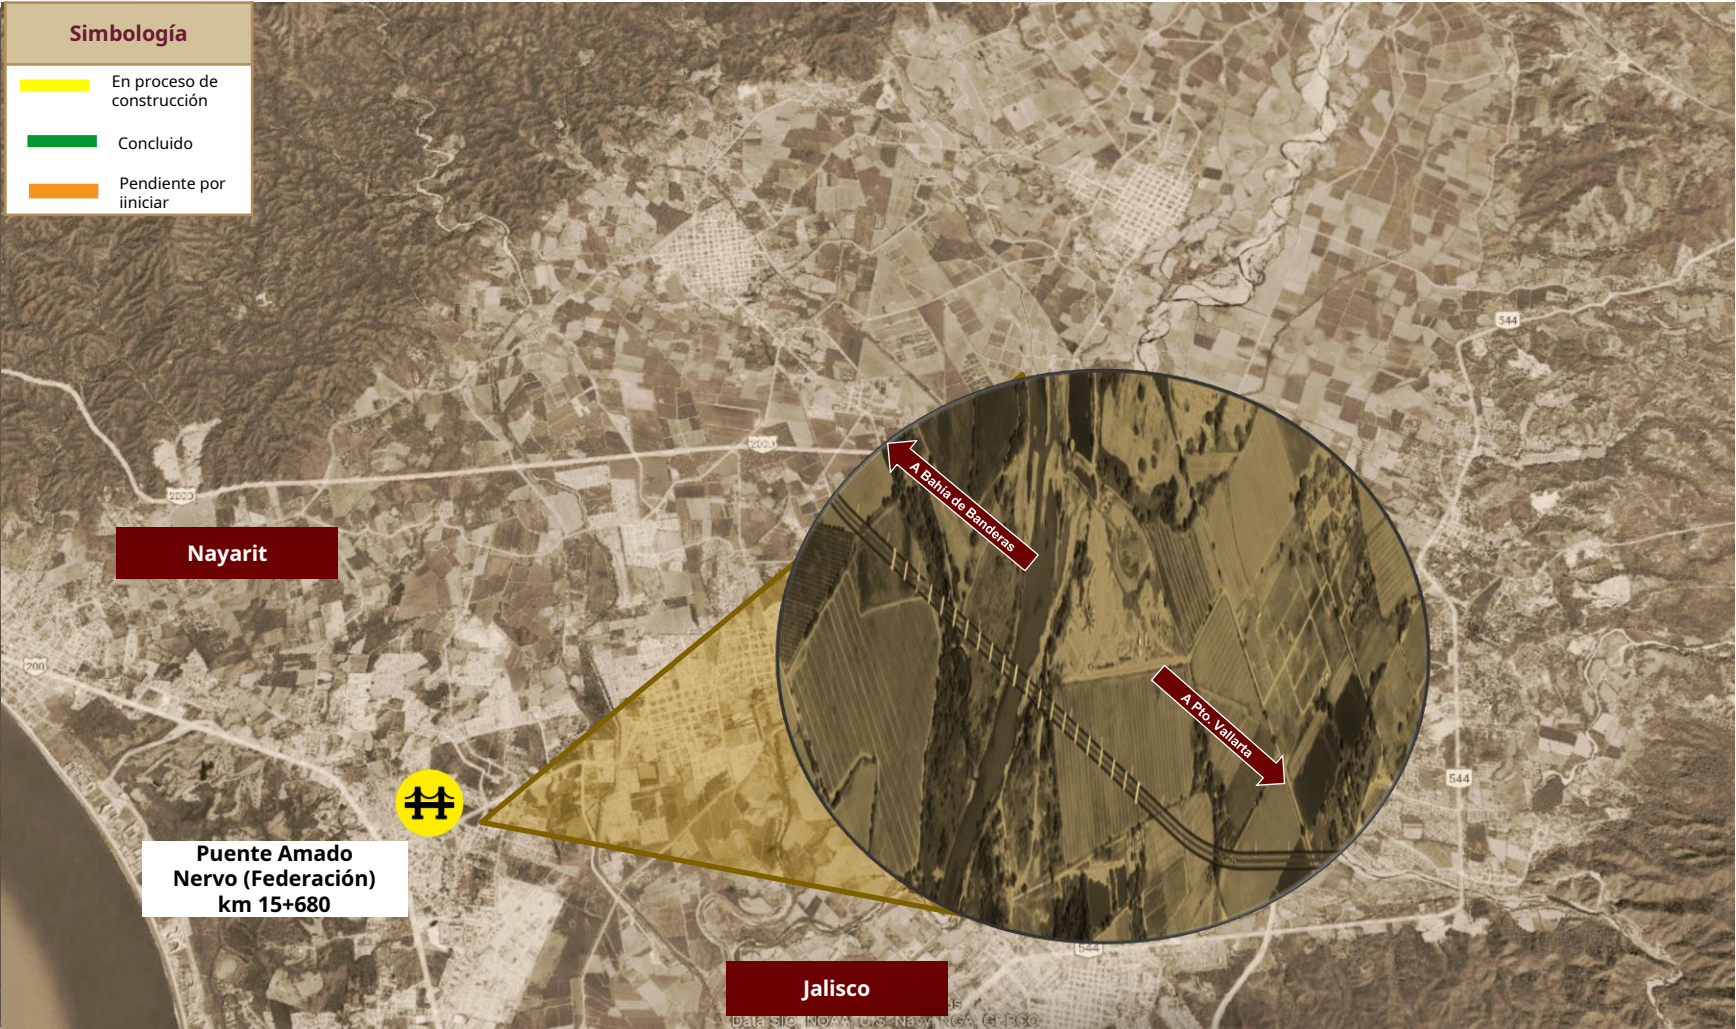

Inversión total 2025-2026: 900.0 mdp
Inversión 2025: 200.0 mdp | 0.4 km de Puente



Meta total: 1 Puente | 0.798 km
Accesos | 1.222 km



Inicio: 14 de julio de 2025
Término: 31 Diciembre de 2026
Termino meta 2025: 31 de diciembre



479,471 habitantes beneficiados



2,700 empleos generados



25 min ahorro en tiempo

Empresas

- **Contratista:** Regiomontana de Construcción y Servicios, S.A.P.I. de C.V., Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. y JYR Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.
- **Supervisión:** Zambrano y Asociados, Ingeniería Civil, S. de R.L. de C.V.

Puente Amado Nervo (Federación) km. 15+680

(Carretera Fed. MEX-200) Nayarit y Jalisco

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 19 al 25/09/25		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
ACCESOS								
Desmonte	Ha.	7.0	0.60	8.6%	6.40	0.50	0	Se inició desmonte lado Jalisco.
Despalme	m3	14,042.0	5,764.00	41.0%	8,278.0	877.6	1,467	Despalme concluido lado Nayarit
Cortes	m3	10,823.0	0	0.0%	10,823.0	0	0	Se continuan trabajos de pedraplén en el lado Nayarit.
Terraplenes	m3	161,117.0	3,147	2.0%	157,970.0	0	1,467	
Base Estabilizada	m3	6,192.0	0	0.0%	6,192.0	0	0	
Carpeta de Concreto Hidráulico	m3	9,687.0	0	0.0%	9,687.0	0	0	
Losas de Acceso	m3	83.0	0	0.0%	83.0	0	0	
INFRAESTRUCTURA								
Pilotes	pza.	126	56	44.4%	70	6.0	19	Se tienen colados 56 pilotes, asimismo se tienen armados 20 pilotes
SUBESTRUCTURA								
Columnas	pza.	126	3	0	123.00	0	3	Se tienen coladas 3 columnas del apoyo 18
Cabezales	pza.	21	0	0	21	0	0	
SUPERESTRUCTURA								
Trabes tipo NU-220 (fabricación)	pza.	160	0	0.0%	160	0	0	
Trabes tipo NU-220 (montaje)	pza.	160	0	0.0%	160	0	0	
Losas y Diafragmas	m3	4,450.40	0	0.0%	4,450.40	0	0	
Parapeto y Guarnición	m	1,597.00	0	0.0%	1,597.00	0	0	
Obras de Drenaje	pza.	4.00	0	0.0%	4.00	0	0	
PASOS SUPERIORES VEHICULARES								
PSV's	pza.	2.00	0.2	10.0%	1.80	0	0	Se trabaja en armado de acero para PSV lado Nayarit.
OBRAS COMPLEMENTARIAS								
Obras Complementarias	lote.	1.00	0	0.0%	1.00	0	0	
SEÑALAMIENTO								
Señalamiento	lote.	1.00	0	0.0%	1.00	0	0	
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD								
Dispositivos de Seguridad	lote.	1.00	0	0.0%	1.00	0	0	

