

**PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez**  
Sinaloa



**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

## Avance global

- Programado: 1.58%
- Semanal: 4.19%
- Real: 12.54%
- Financiero: 7.04%

## Avance 2025

- Programado: 3.16%
- Semanal: 8.4%
- Real: 25.1%
- Financiero: 12.6%



**Inversión total 2025-2026:** 380.0 mdp  
**Inversión 2025:** 200.0 mdp | (50% de PSV)



**Meta total:** PSV | 0.811 km longitud total

**Nota:** Se trata de un proyecto integral (donde la contratista elabora también el proyecto ejecutivo). Se reportó el 5 de septiembre una meta de 0.360 km que correspondía únicamente a la estructura; al contar ya con un anteproyecto completo a la fecha, la longitud total del proyecto es de 0.811 km ya incluyendo los accesos.



**Inicio:** 18 de agosto de 2025

**Término:** Agosto 2026

**Término meta 2025:** Diciembre



**862,037** Habitantes beneficiados




**1,140** empleos generados



**20 min** ahorro en tiempo

## Empresas

- Contratista: ESMA Instalaciones, S.A. de C.V.
- Supervisión: Constructora y Supervisora GESCO, S.A. de C.V.

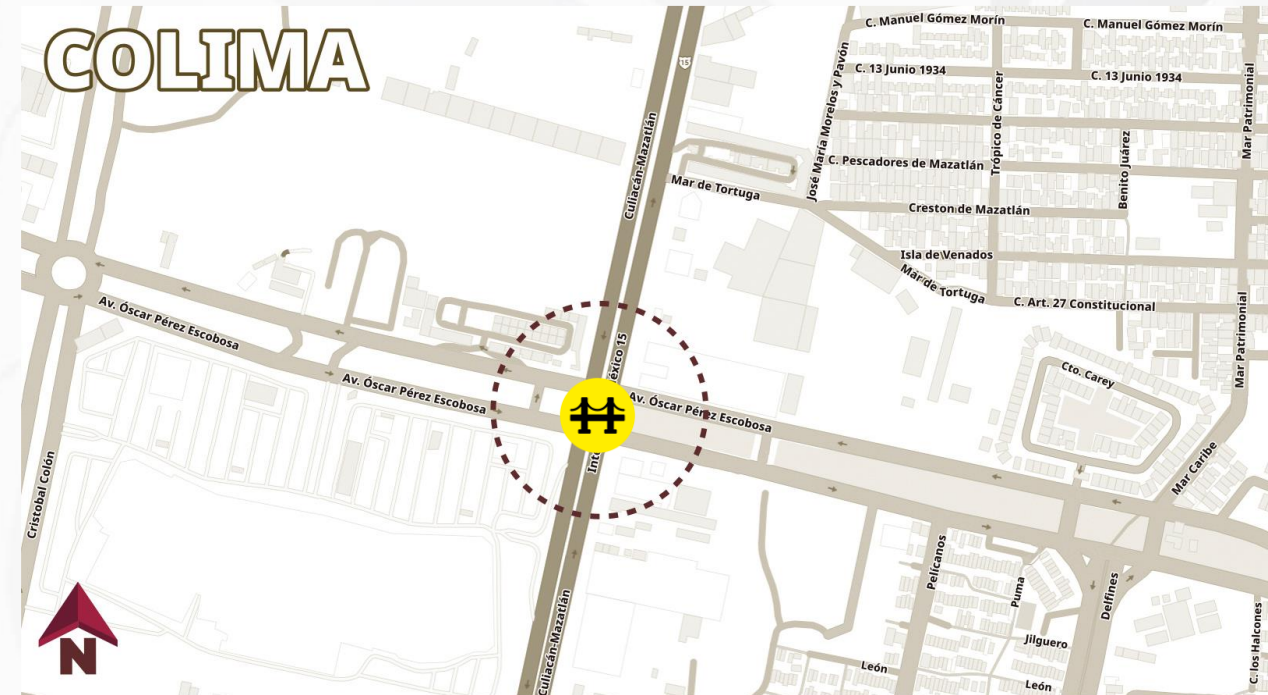


### Nivel de Servicio C



## Situación actual

### Nivel de Servicio en estudio

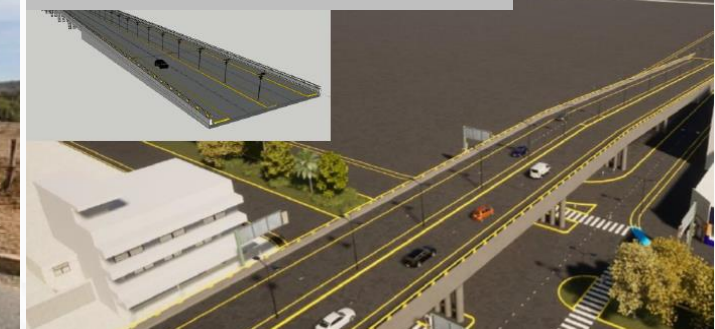

## Proyecto

# PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez Sinaloa

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado		Faltante	Ejecutado del 19 al 25/09/25		Observaciones
						Programado	Ejecutado	
PRECIO ALZADO								
Estudios y Proyecto Ejecutivo	Actividad	2	1.1	55.0%	0.9	0.1	0.3	Se continua trabajos de sondeos
Obras inducidas	Actividad	8	0	0.0%	8	0	0.0	
Cimentación	Apoyo	9	7	77.8%	2	1.3	5.0	Se tiene un total de 23 pilotes concluidos
Columnas y Cabezales	Apoyo	9	0.5	5.6%	8.5	0	0.5	
Superestructura (Fabricación y Montaje de Trabes, Diafragma, Juntas, Guarnición, Parapeto y Drenaje Pluvial)	Actividad	8	0	0.0%	8	0	0.0	
Muro Mecánicamente estabilizado	Actividad	5	0	0.0%	5	0	0.0	Se inició el proyecto del Muro Mecánicamente Estabilizado con la patente de Tierra Armada.
Losa de concreto Hidráulico	Actividad	2	0	0.0%	2	0	0.0	
Alumbrado y señalamiento	Actividad	4	0	0.0%	4	0	0.0	
Semaforización	Actividad	1	0	0.0%	1	0	0.0	
PRECIO UNITARIO								
Terraplenes	m3	5,032.00	0	0.0%	5,032.00	0	0	
Base Hidráulica	m3	3,992.00	0	0.0%	3,992.00	0	0	
Riego de impregnación	m2	20,330.00	0	0.0%	20,330.00	0	0	
Fresado de superficie	m2	23,420.00	0	0.0%	23,420.00	0	0	
Banqueta	m2	6,922.00	0	0.0%	6,922.00	0	0	
Relleno	m3	692.00	0	0.0%	692.00	0	0	

