

# Distribuidor Vial Santa Ana Tlaxcala

Avance global

• Programado: 3.85%

• Real: 5.40%

• Semanal: 1.70%

• Financiero: 3.60%

Avance 2025


• Programado: 27.50%


• Real: 38.57%


• Semanal: 12.14%


• Financiero: 25.71%


 **Inversión total 2025-2026:** 650 mdp  
**Inversión 2025:** 100 mdp | 14% de 1 Distribuidor Vial

 **Meta total:** 1 Distribuidor | **1.204 km** (0.654 km estructura, 0.177 km rampa de entrada, 0.118 km rampa salida y 0.255 km fresado y carpeta en accesos)


 **Inicio:** 16 de julio de 2025  
**Término:** 31 de diciembre de 2026  
**Termino meta 2025:** 31 de diciembre

 **73,215** habitantes beneficiados

 **1,950** empleos generados

 **20 min** ahorro en tiempo

Tramo	Empresas
KM 29+420 AL KM 30+028	<div><div>• Contratista: PROACON MÉXICO, S.A. DE C.V. - CONSTRUCCIONES ALDESEM, S.A. DE C.V. - CONSORCIO DE INGENIEROS</div><div>• CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V.,</div><div>• Supervisión URBA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</div></div>

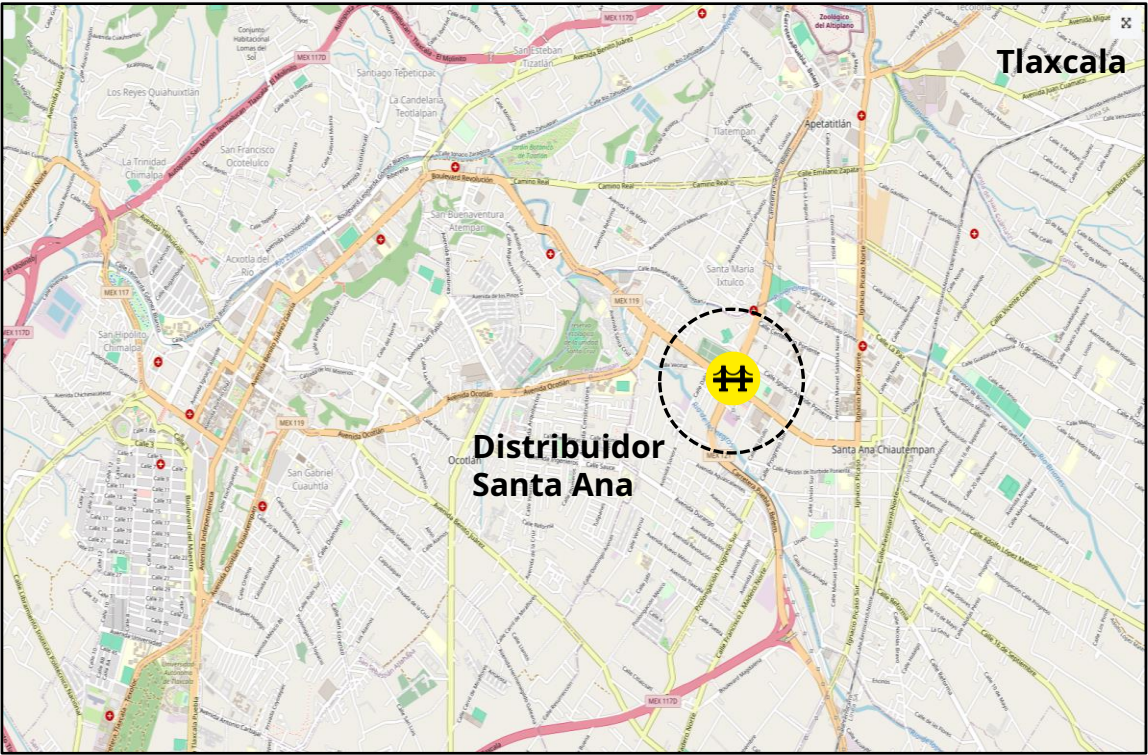


# Distribuidor Vial Santa Ana

## Tlaxcala

Elemento	Meta	Ejecutado Acumulable	Faltante	18 al 25-09-25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Distribuidor Vial	14% de 1 Distribuidor Vial	5.40% del 14% de 1 Distribuidor Vial	8.6% del 14% de 1 Distribuidor Vial	0.63%	1.70%	Se trabaja en pilas de los ejes #4,5,11,14 y 17 y zapatas del eje #13 y 15.

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

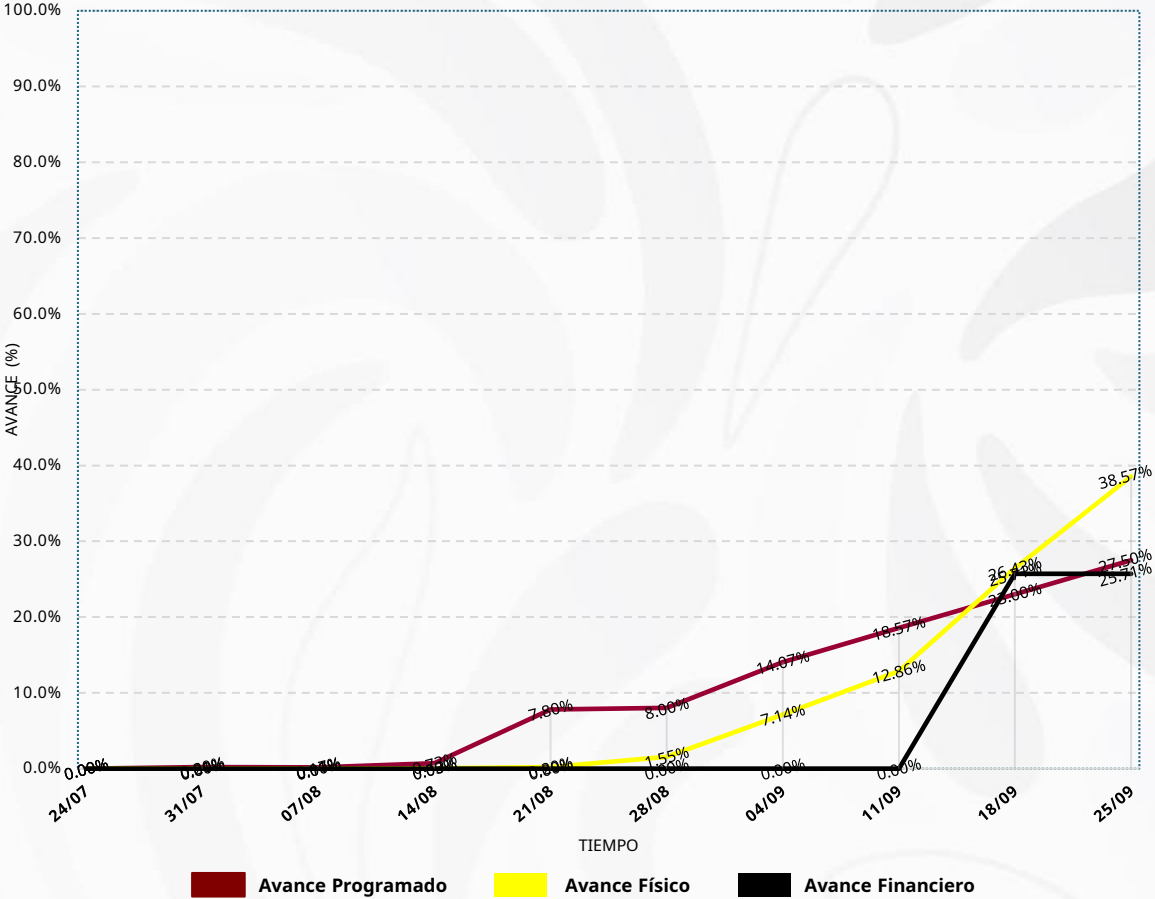

	12 al 18 de septiembre	19 al 25 de septiembre
Fuerza de Trabajo (personas)	93	100
Maquinaria	20	22
