Glorieta "FONATUR"

Los Cabos, BCS (Carretera Cabo San Lucas – La Paz)



Avance global • Programado: 27.81% • Semanal: 1.12% • Real: 39.14% • Financiero: 34.03%

• Programado: 69.52% • Semanal: 2.80% • Real: 97.85% • Financiero: 76.62%

Inversión total 2025-2026: 450 mdp Inversión 2025: 200 mdp | 0.6 km del Deprimido

Meta total: 1 Deprimido | 1.5 km Gasas | 4.1 km


Inicio: 12 de mayo de 2025
Término: Junio de 2026
Término meta 2025: Diciembre

351,000 habitantes beneficiados

1,350 empleos generados

25 min ahorro en tiempo

Tramo	Empresas
km 30+300	 Contratista: Convenio de participación conjunta de: TRITURADOS Y ASFALTOS DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V., PLACOSA, S.A. DE C.V. E INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DICSSA, S.A. DE C.V. Supervisión: INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.

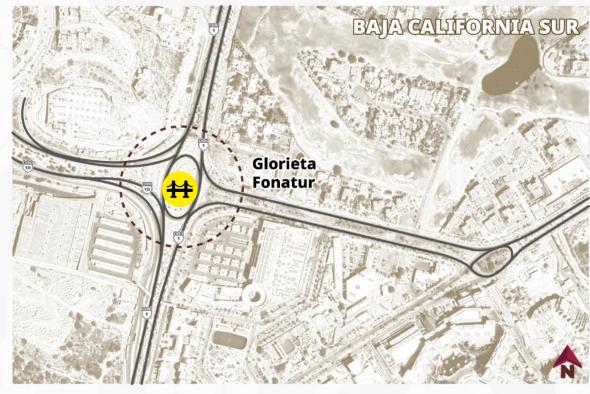





Baja California Sur

Glorieta Fonatur (Carretera Cabo San Lucas – La Paz)



	Ejecutado Ejecutado			19/09/25 al 25/09/25			
Elemento	Meta	acumulado	Faltante	Programado	Ejecutado	Observaciones	
		Preliminares					
Retiro de vegetación	500 pzas	480 pzas	20 pzas	0 pzas	0 pzas		
Reubicación de Monumento FONATUR	1 pza	0.7 pza	0.3 pza	0 pzas	0 pza	// //	
		Canal Tipo Cajó	n				
Canal tipo cajón	1,099.4 m	1,099.4 m	-	-	-	Concluido	
		Terracerías					
Terracerías	14,112 m3	4,200 m3	9,912 m3	0 m3	0 m3		
Subbase	4,776 m3	0 m3	4,776 m3	0 m3	0 m3		
Base hidráulica	11,840 m3	1,590 m3	10,250 m3	0 m3	440 m3		
	Estru	ctura Paso Inferior	Vehicular				
Zapatas	20 pzas	4 pzas	16 pzas	1.8 pzas	0 pzas		
Muros de 2 a 7 m	20 pzas	4 pzas	16 pzas	1.4 pzas	0 pzas		
Pilas tangentes	1,100 pzas	569 pzas	531 pzas	55 pzas	59 pzas		
Trabes de liga	1,597.2 m	260 m	1,337.2 m	0 m	0 m	la.	
Fabricación de cabezal	8 pzas	0 pzas	8 pzas	0 pzas	0 pzas		
Fabricación trabes AASHTO tipo III	52 pzas	10 pzas	42 pzas	0 pzas	4 pzas		
Montaje trabes AASHTO tipo III	52 pzas	0 pzas	52 pzas	0 pzas	0 pzas		
Guarnición y banquetas	3,629.2 m3	0 m3	3,629.2 m3	0 m3	0 m3		
Pavimento rígido	5,227 m3	0 m3	5,227 m3	0 m3	0 m3		
Pavimento flexible	34,720 m3	142.08 m3	34,577.92 m3	0 m3	0 m3		
Parapeto	1,795.2 m	0 m	1,795.2 m	0 m	0 m		
		Semaforización					
Semaforización	100%	0%	100%	0%	0%		
		Obra inducida					
Reubicación de línea de media tensión de CFE	2,275 m	1,400 m	875 m	0 m	0 m		
Reubicación de acueducto	1,023 m	1,023 m	-		- (Concluido	
Reubicación de línea de distribución	910 m	770 m	140 m	0 m	0 m		

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Glorieta Fonatur km 30+300 100.0% 30.0% 20.0% 10.0% **Avance Financiero** Avance Programado **Avance Físico** 12 de septiembre al 18 de septiembre 19 de septiembre al 25 de septiembre Fuerza de Trabajo (personas) 101 15 15 Maquinaria
