#### **PSV Arco Norte**

#### Colima

Avance global • Programado: 11.45% • Semanal: 1.04%

• Real: 16.98% • Financiero: 11.05%

**Avance 2025** • Programado: 33.58% • Semanal: 3.05%

• Real: 49.78% • Financiero: 32.40%

Inversión total 2025-2026: 369.7 mdp Inversión 2025: 127.4 mdp

Meta total: 590 m longitud total, 298 m

estructura, 292 m accesos.

Meta 2025: 298 m subestructura

Inicio: 10 de junio de 2025 Término: 09 de junio de 2026 Término meta 2025: diciembre

306,810 habitantes beneficiados


(a) 1,109 empleos generados

15 min ahorro en tiempo

Tramo	Empresas
Construcción del Paso Superior Vehicular "Arco Norte"	<ul> <li>Contratista: IDEVVSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V Y CONSORCIO CONTINENTAL DE INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V</li> <li>Supervisión: JUVISA, INGENIERÍA, S.A DE C.V</li> </ul>



## ACTUALIZADA Comunicaciones

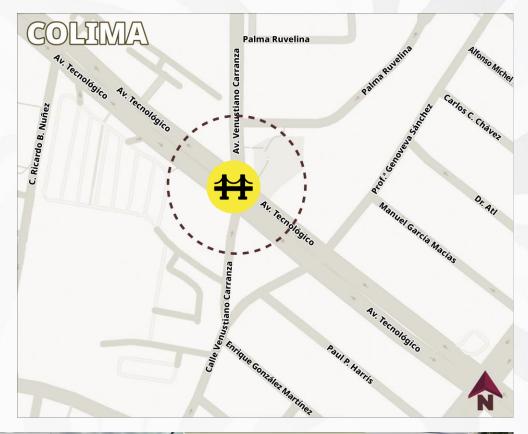



### **PSV Libramiento Arco Norte**


#### Colima

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	19/09/25 al 25/09/25		Observaciones			
Elements				Programado	Ejecutado	observaciones			
Trabajos dive	Trabajos diversos								
Desmantelamiento de dispositivos existentes (pza)	530.0	530.00	0.00	0.00	0.00				
Demolición (m)	350.0	350.00	0.00	0.00	0.00				
Red de media tensión subterránea (m)	2,100.0	2,100.00	0.00	0.00	165.39				
Reubicación acueducto 36" (m)	736.0	736.00	0.00	0.00	8.63				
Terracerías									
Corte (m³)	9,295.00	0.00	9,295.00	0.00	0.00				
Terraplén (m³)	9,292.00	0.00	9,292.00	0.00	0.00				
Subyacente (m³)	3,233.00	0.00	3,233.00	0.00	0.00				
Subrasante (m³)	4,706.00	0.00	4,706.00	0.00	0.00				
Subestructura									
Pilas (pza)	66.00	33.00	33.00	4.13	0.00				
Zapatas (pza)	20.00	8.00	12.00	1.25	1.00				
Columnas (pza)	42.00	15.00	27.00	2.63	4.00				
Cabezales (pza)	22.00	2.00	20.00	1.38	1.00				



# ACTUALIZADA Comunicaciones

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

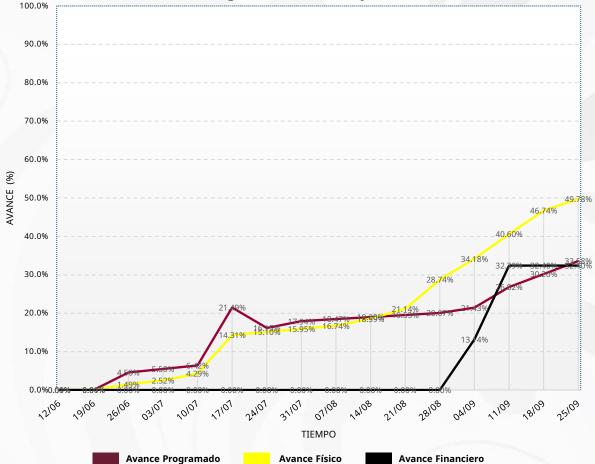

	12 de septiembre al 18 de septiembre	19 de septiembre al 25 de septiembre		
Fuerza de Trabajo (personas)	77	77		
Maquinaria	14	14		
