# **Tabasco-Campeche**

## Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186) Tramo Tabasco





**Avance global** • Programado: 7.69%

• Real: 7.19%

 Semanal: 0.50% Financiero: 4.46% Avance 2025

Programado: 64.12% Semanal: 4.16% Real: 59.93%

Financiero: 49.75%

#### 1.- ALZ Construcciones, S.A. de C.V.

Meta: 4 km (48+000 al 52+000), 1 Puente y 1 PIPR.

Inversión: \$313,919,013.89 C/IVA

#### 2.- COCONAL, S.A.P.I. de C.V.

Meta: 4 km (52+000 al 56+000), 1 Entronque, 2 Retornos y 1 PIPR. Inversión: \$303,835,307.30 C/IVA

#### 3.- Grupo Comercial y Constructora Aqua Blanca, S.A. de C.V. y Construcciones MARCKASA, S.A. de C.V.

Meta: 4 km (56+000 al 60+000), 1 Puente, 1 Retorno y 2 PIPRs. Inversión: \$328,492,607.36 MDP C/IVA


#### 4. COCONAL, S.A.P.I. DE C.V.

Meta: km (km 293+960 al km 294+550), 2 Entr. a nivel km 293+960 y km 294+550 Inversión: \$274.865.519.08 C/IVA

#### Supervisiones

#### S1. CANAN, Ingeniería, Consultoría Y Medio Ambiente, S.A. de C.V.

Meta: Supervisión de los Trabajos de Modernización y Ampliación Inversión: \$9.144.863.79 C/IVA

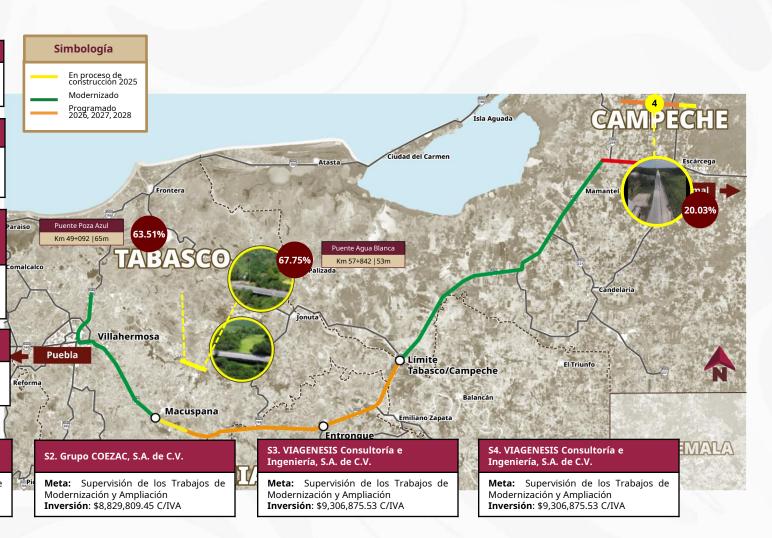

Inversión total 2025-2028: 11,607 mdp

Tabasco: 3,659 mdp Campeche: 2,257 mdp Chiapas: 5,691 mdp

Inversión 2025: 1,410 MDP /16 km

• Tabasco: 1,060 mdp | 12 km, 1 entrongue y 2 puentes

• Campeche: 350 mdp | 4 km, y 2 entronques

Meta total 2025-2028: |134 km | Ampliación a 22 m (A4)

Tabasco • 43 km | Chiapas • 66 km | Campeche • 25 km

Inicio: 16 de marzo de 2025 Término: Diciembre 2028

Término meta 2025: 31 Diciembre

2025

**34,821** empleos generados

760 mil habitantes beneficiados

40 minutos de ahorro en tiempo

301 km longitud total 170 km Ampliados (A2 y A4)

# **Tabasco-Campeche**

## Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186) Tramo Tabasco


### Km 48+000 - km 60+000

Elemento	Intervención	Unidad	Ejecutado	Faltante	19/09/25 al 25/09/25	
			acumulado		Programado	Ejecutado
Despalme	47,422.66	ha	47,422.66	0.00	0.00	0.00
Corte en Pavimentos	17,284.05	m3	17,284.05	0.00	0.00	4,612.00
Material no compactable	45,780.00	m3	42,582.43	3,197.57	2,640.60	4,187.11
Rayado energico	227,451.65	m3	201,737.07	25,714.58	0.00	679.87
Excavación de cortes	16,038.80	m3	14,745.37	1,293.43	282.05	0.00
Escalones de Liga	122,345.53	m	122,345.53	0.00	26.68	0.00
Pedraplén	93,920.00	m3	91,316.72	2,603.28	232.89	0.00
Geotextil	93,920.00	m3	91,316.72	2,603.28	149.40	0.00
Geomalla	222,101.60	m3	209,156.73	12,944.87	149.40	0.00
Terraplén 90%	207,867.61	m2	159,962.68	47,904.93	240.49	1,000.00
Subyacente 95%	91,314.31	m2	75,720.95	15,593.36	3,226.33	4,000.00
Subrasante 100%	82,900.33	m3	63,403.81	19,496.52	2,382.00	3,254.00
Acero de refuerzo en O.D	85,132.90	m3	72,626.00	12,506.90	259.95	0.00
Base hidraulica	32,689.43	m3	28,667.00	4,022.43	4,928.17	9,342.30
Base asfaltica	281,951.60	kg	245,700.01	36,251.59	2,385.02	4,515.33
Riego de impregnación	550,983.26	m3	309,085.01	241,898.25	20,239.24	37,309.36
Riego de liga	3,262.95	m3	3,262.95	0.00	40,810.23	53,062.11
Relleno con material	1,239.94	m2	425.10	814.84	5.18	500.00
Cunetas y lavaderos	0.00	m2	0.00	0.00	48.97	172.00
Reubicación de postes CFE	33.00	kg	24.00	9.00	2.70	3.00





### Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Macuspana - Escárcega

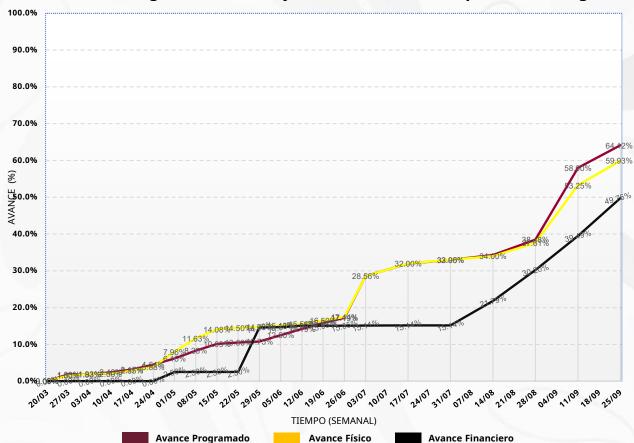

12 de septiembre al 18 de septiembre 19 de septiembre al 25 de septiembre

Fuerza de Trabajo (personas)

428

450

Maquinaria

128

128
