Sonora/Chihuahua

Camino Límite Estados Chihuahua/Sonora-Pancho Villa-E.C. (Janos-Monte Verde)





1.- Constructora URBATRAC. S.A. de C.V.

Meta: Km 0+000-km 11+000, incluye entrongue km 0+000 Inversión: 324.6 MDP C/IVA

2.- ESMA Instalaciones, S.A. de C.V.

Meta: Km 11+000-km 18+093 km Inversión: 306.2 MDP C/IVA

3.- INNOVACIONES INTELIGENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V Y CMCO, S.A DE C.V

F. Km 6+900 Puente I. 122.0 m G. Km 14+700 Puente II, 61.5 m

4.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PROYECTOS **INTERESTATALES.S.A DE C.V**

Por modernizar a nivel de pavimento a 7.0 m Meta: Km 18+093 - km 29+093

5.- La CIMA Terraceros, S.A. de C.V. y Estructuras y Excavaciones IM. S.A. de C.V.

Meta: Km 29+093-KM 47+233 Inversión: 193.9 MDP C/IVA


6.- MERP Edificaciones y Terracerías, S.A. de C.V.

Meta: Km 47+233-Km 59+823 y Km 66+422-Km 66+829, incluye Boulevard y entrongue a nivel.

Inversión: 179.4 MDP C/IVA

Avance físico

- Programado: 52.0 %
- Semanal: 1.5%
- Real: 47.0 % • Financiero: 27.3%

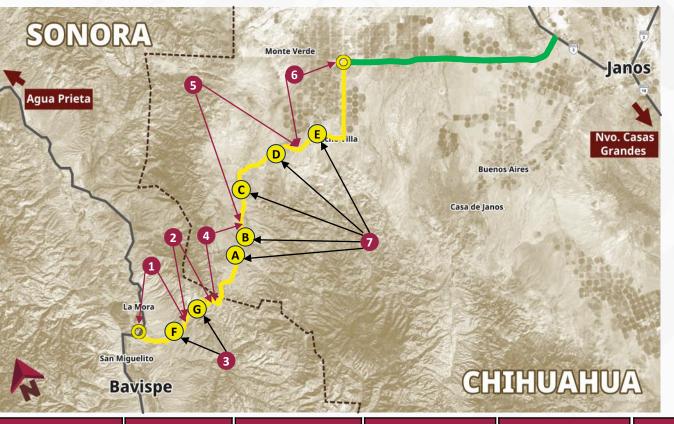



Inicio: marzo, 2025

Término: diciembre de 2025

- Meta total: 67 km y 7 puentes • 6.6 km modernizados C, Chihuahua (se requiere trabajos complementarios)
- Meta pendiente: 60.2 km y 7 puentes Sonora
 - 18.1 km, ampliación C
 - 2 puentes (184 m)

Chihuahua

- 42.1 km, ampliación C
- 5 puentes (320 m)
- 5,577 empleos generados
- 4,713 habitantes beneficiados
- 90 minutos de ahorro en tiempo

7.- Asfaltos y Triturados EL PUJAL, S.A. de C.V.

En proceso de construcción de 5 puentes:

- A. Km 22+758 El Papalote, 30.0 m
- B. Km 25+758 Los Pilares, 40.0 m
- C. Km 33+832 Las Profesoras, 40.0 m
- D. Km 36+682 La Enramada, 30.0 m

E. Km 38+362 La Pila, 120.0 m Inversión: 122.5 MDP C/IVA

S1.- CLAMI **INGENIEROS, S.C**

Tramo: del km 0+000 al km 11+000, puente Sonora I en el km 6+900 Inversión: 6.1 MDP C/IVA

S2.- NEDOX. S.A DE C.V

Tramo: del km 11+000 al km 18+093, puente Sonora II en el km 14+700 Inversión: 6.8 MDP

C/IVA

S3.- JIDASA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V

Tramo: tramo del km 18+093 al km 29+093, 5 puentes Chihuahua Inversión: 7.5 MDP C/IVA

S4.- GSM SUPERVISIÓN PROYECTO E IMPACTO AMBIENTAL, S.A DE C.V

Tramo: tramo del km 29+093 al km 59+822, del km 66+422 al km 66+828 Inversión: 7.5 MDP C/IVA

S5.- GRUPO SELOME, S.A. DE C.V

Tramo: Manifestación de Impacto Ambiental y de Cambio de Uso de Suelo Forestal, Chihuahua Inversión: 6.7 MDP C/IVA

S6.- PROVEEDORA DE INGENIERIA. INSTALACION E INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V

Tramo: implementación v ejecución de medidas de mitigación de la Manifestación de Impacto Ambiental, Sonora Inversión: 14.0 MDP C/IVA

S7.- GRUPO CORPOSIIA, S.A. DE C.V.

Tramo: implementación v eiecución de medidas de mitigación de la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad regional, Sonora Inversión: 10.5 MDP C/IVA

Sonora/Chihuahua


E.C. (Agua Prieta-Bavispe)-Pancho Villa-E.C. (Janos-Monte Verde)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	19-09-25 al 25-09-25		Observations
				Programado	Ejecutado	Observaciones
Ampliación: Tramo Sonora	18	47.25%	52.75%	0.96%	0.8%	Maquinaria y equipo insuficiente Obras de drenaje
Ampliación: Tramo Chihuahua	42	46.38%	53.62%	5.15%	3.5%	Se solicita a las empresas reforzar los acarreos de materiales
Construcción Puentes (Chihuahua)	5	23.39%	76.61%	59.18%	2.83%	Se solicita la llegada de las grúas para montaje de trabes y de bomba de concreto
Construcción Puentes (Sonora)	2	23.9%	76.1%	1.2%	1.8%	





Avance Programado - Físico - Financiero (%)

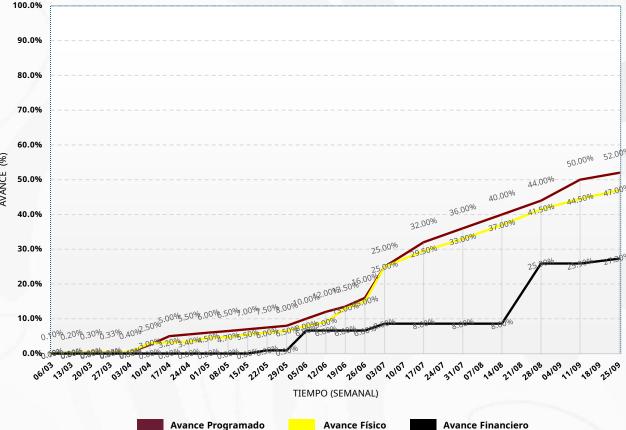

	12 de septiembre al 18 de septiembre	19 de septiembre al 25 de septiembre
Fuerza de Trabajo (personas)	624	650
Maquinaria	371	369
