Circuito Tierra y Libertad

Puente Jojutla (Morelos)



Inversión: 26.6 mdp

Meta: 1 puente de 0.270 km (0.04 km estructura y 0.230 km de accesos)

Avance programado: 100.0%

Avance real: 95.0%

Avance financiero: 84.8%

Fecha de inicio: 26 de marzo, 2025

Fecha de término: 24 de septiembre, 2025


35,897 habitantes beneficiados

80 empleos generados

O 20 minutos de ahorro de tiempo

Optimiza la Conexión de las comunidades aledañas al Circuito Tierra y Libertad, modernizando el tramo vehicular existente

Tramo	Empresas
Construcción "Puente Jojutla"	 Contratista: Consultoría y Construcciones SIBAMSA, S.A. de C.V. y Corporativo Constructor IOBSA, S.A. de C.V.
	• Supervisión: Especialista en Diseño de Infraestructura Funcional, Ingenieros, S.A de C.V.

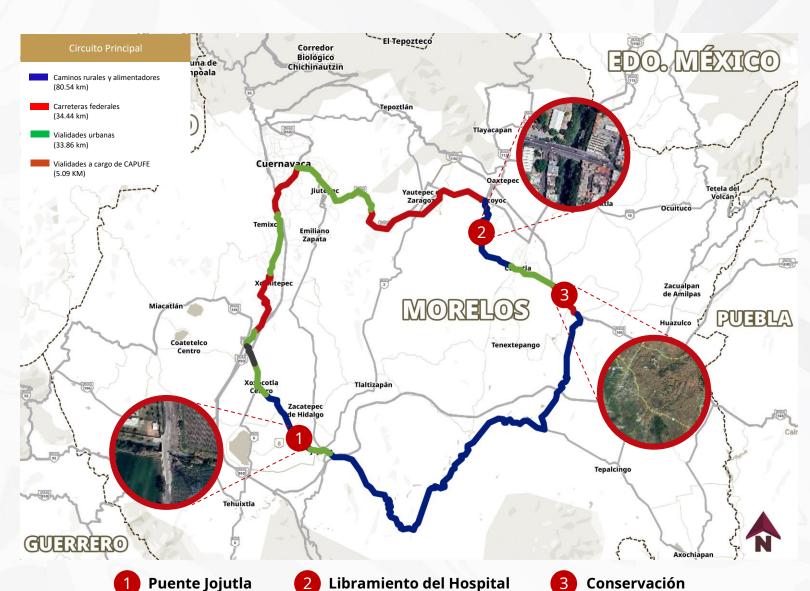


Morelos

Puente Jojutla

	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	19/09/25 al 25/09/25		
Elemento				Programado	Ejecutado	Observaciones
Resumen de Obra						
Cabezales (Pza)	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	
Montaje de trabes Pretensadas (Pza)	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	
Losa (m2)	367.2	367.2	0.0	0.0	0.0	
Carpeta Asfáltica (m3)	11.43	0.0	11.43	11.43	0.0	
Terracerías Accesos (m3)	127.0	114.3	12.7	12.7	12.7	
Guarniciones, Parapetos y Banquetas (m)	81.6	81.6	0.0	4.1	4.1	
Armado de columnas en muro (Pza)	8.0	6.0	2.0	0.0	0.0	
Colado de columnas en muro (Pza)	8.0	8.0	0.0	2.0	6.0	
Armado de muros (Pza)	2.0	1.0	1.0	0.5	0.0	
Colado de muros (Pza)	2.0	1.0	1.0	0.5	0.0	



Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

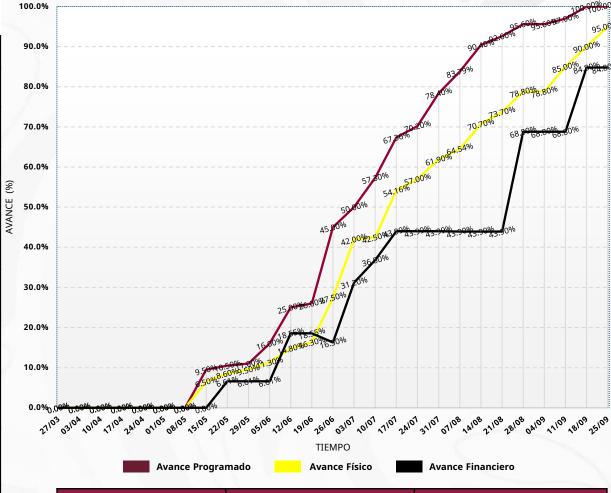

	12 de Septiembre al 18 de Septiembre	19 de Septiembre al 25 de Septiembre		
Fuerza de Trabajo (personas)	82	54		
Maquinaria	58	39		
